

# CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

## COMITÉ DIRECTIVO

### AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021


14 de enero de 2022



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.




<b>VALOR TOTAL CVP 2021</b>		<b>118.190.295.026</b>
<b>Ejecución a diciembre</b>	<b>94,56%</b>	<b>111.756.998.599</b>
<b>Sin comprometer</b>	<b>5,44%</b>	<b>6.433.296.427</b>

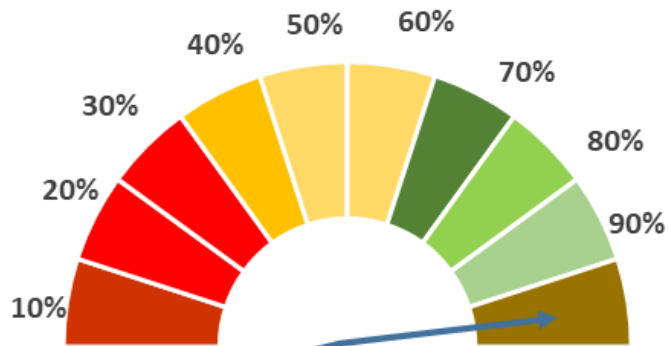

Ejecución vigencia – diciembre 2021

CDP	CRP	GIROS
111.754.623.624	111.756.998.599	65.989.391.524
94,55%	94,56%	55,83%

<b>Total Reservas CVP 2021</b>		<b>18.424.404.546</b>
<b>BMT</b>	11,80%	2.174.843.983
<b>UNCSAB</b>	88,20%	16.249.560.563
<b>Girado a diciembre</b>	<b>99,28%</b>	<b>18.291.645.449</b>
<b>Por girar</b>	<b>0,72%</b>	<b>132.759.097</b>

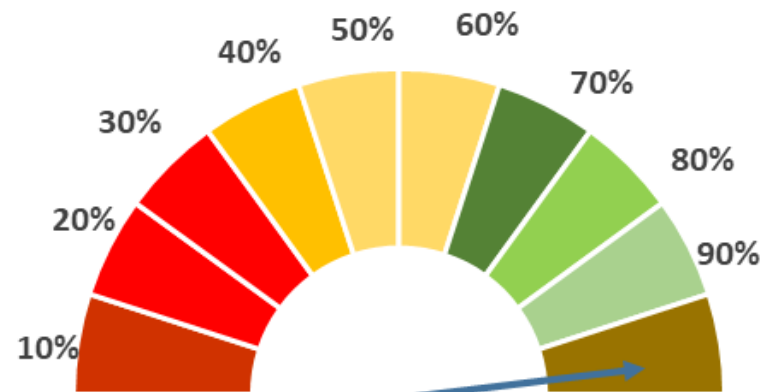

Giros reservas – diciembre 2021 / reservas BMT + UNCSAB

## Pasivos exigibles

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2020	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar diciembre 2021
Dirección Mejoramiento de Vivienda	0	0	0	0
Dirección de Mejoramiento de Barrios	1.243.475.545	552.401.314	278.351.884	412.722.347
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	109.244.711	1.823.567	107.421.144	0
Dirección de Reasentamientos Humanos	8.720.827.182	706.497.964	824.018.384	7.190.310.834
Dirección Corporativa - Fortalecimiento	95.152.738	45.320.001	0	49.832.737
Dirección Corporativa - Comunicaciones	5.429.589	5.185.200	244.389	0
Dirección Corporativa - TICs	54.540.771	22.757.547	31.783.224	0
Dirección Corporativa -Funcionamiento	84.588.588	21.071.666	60.700.533	2.816.389
<b>TOTAL CVP</b>	<b>10.313.259.124</b>	<b>1.355.057.259</b>	<b>1.302.519.558</b>	<b>7.655.682.307</b>

## EJECUCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAJA DE VIVIENDA POPULAR	Apropiación Inicial 2021	Modificaciones	Apropiación Vigente	CDP	%	Compromisos	%	Giros	%	Saldo por Pagar
Gastos Funcionamiento	\$11.766.415.000	16.697.370	\$11.783.112.370	\$11.414.737.507	96,87%	\$11.414.737.507	96,87%	\$11.093.123.916	94,14%	\$321.613.591
Proyectos de Inversión	\$119.580.962.000	-1.390.666.974	\$118.190.295.026	\$111.754.623.624	94,55%	\$111.756.998.599	94,56%	\$65.989.391.524	55,83%	\$45.767.607.075
<b>TOTAL</b>	<b>\$131.347.377.000</b>	<b>-1.373.969.604</b>	<b>\$129.973.407.396</b>	<b>\$123.169.361.131</b>	<b>94,8%</b>	<b>\$123.171.736.106</b>	<b>94,8%</b>	<b>\$77.082.515.440</b>	<b>59,3%</b>	<b>\$46.089.220.666</b>

Proyecto de Inversión	Apropiación Inicial 2021	Modificaciones	Apropiación Vigente	CDP	%	Compromisos	%	Giros	%	Saldo por Pagar
<b>7680</b> Implementación del Plan Terrazas.	\$15.858.000.000	- 2.637.154.974	\$13.220.845.026	\$12.907.465.450	97,63%	\$12.907.465.450	97,63%	\$10.293.186.173	77,86%	\$2.614.279.277
<b>7684</b> Titulación de predios estratos 1 y 2	\$5.320.785.000	- 656.000.000	\$4.664.785.000	\$4.658.346.179	99,86%	\$4.658.346.179	99,86%	\$4.377.760.722	93,85%	\$280.585.457
<b>7703</b> Mejoramiento integral de barrios	\$65.366.309.000	2.028.569.000	\$67.394.878.000	\$61.456.510.243	91,19%	\$61.456.510.243	91,19%	\$20.798.943.374	30,86%	\$40.657.566.869
<b>7698</b> Traslado de hogares local en zonas de alto riesgo	\$24.764.095.000	- 1.100.000.000	\$23.664.095.000	\$23.511.665.944	99,36%	\$23.514.040.919	99,37%	\$23.010.724.981	97,24%	\$503.315.938
<b>7696</b> Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización	\$8.271.773.000	973.919.000	\$9.245.692.000	\$9.220.635.808	99,73%	\$9.220.635.808	99,73%	\$7.508.776.274	81,21%	\$1.711.859.534

## EJECUCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

### CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2021

PI	Ppto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% CDP
7680	13.220.845.026	12.907.465.450	12.907.465.450	10.293.186.173	2.614.279.277	97,6%
7684	4.664.785.000	4.658.346.179	4.658.346.179	4.377.760.722	280.585.457	99,9%
7696	9.245.692.000	9.220.635.808	9.220.635.808	7.508.776.274	1.711.859.534	99,7%
7698	23.664.095.000	23.511.665.944	23.514.040.919	23.010.724.981	503.315.938	99,4%
7703	67.394.878.000	61.456.510.243	61.456.510.243	20.798.943.374	40.657.566.869	91,2%
<b>Total CVP</b>	<b>118.190.295.026</b>	<b>111.754.623.624</b>	<b>111.756.998.599</b>	<b>65.989.391.524</b>	<b>45.767.607.075</b>	

**7680**



**7684**



**7696**



**7698**



**7703**







Actualizar TD

Mes

a. Enero	b. Febrero	c. Marzo	d. Abril	e. Mayo	f. Junio
g. Julio	h. Agosto	i. Septiembre	j. Octubre	k. Noviembre	l. Diciembre

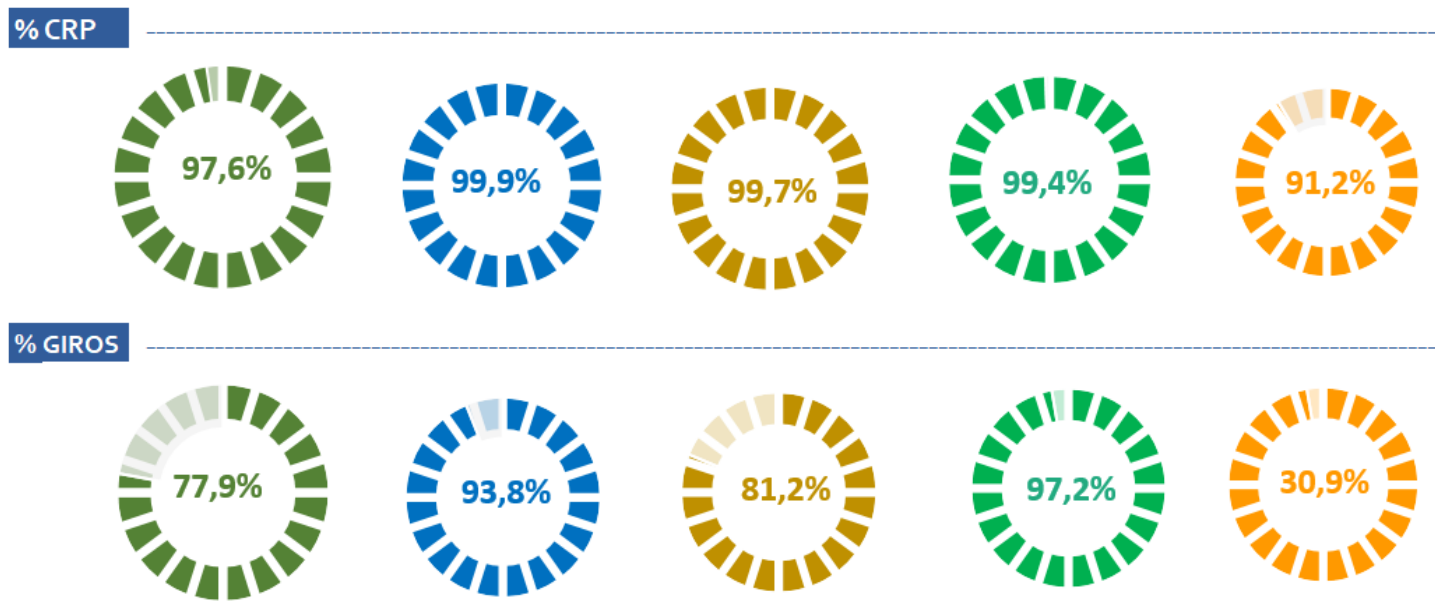
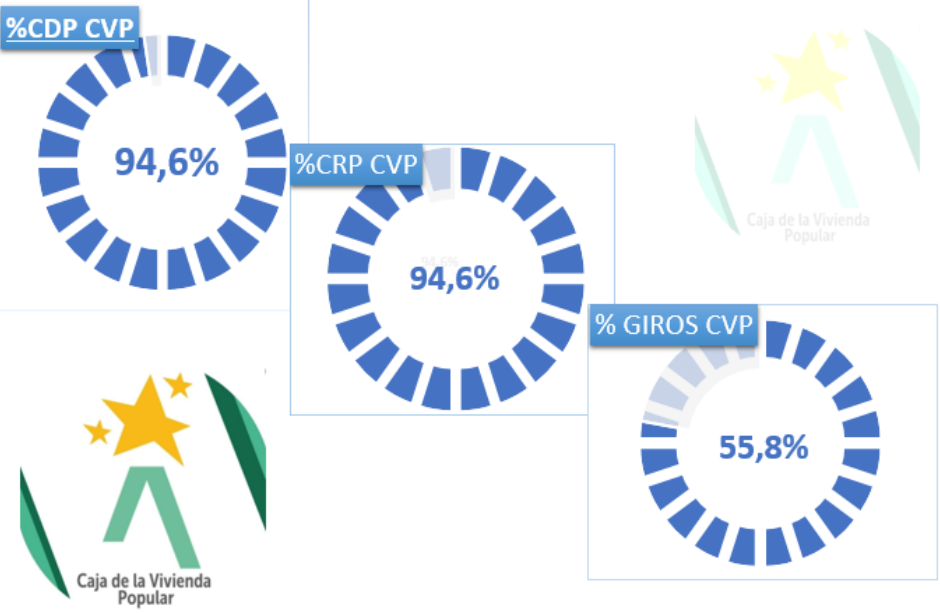


% calculados sobre presupuesto programado

## EJECUCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

### CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2021

PI	Ppto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar
7680	13.220.845.026	12.907.465.450	12.907.465.450	10.293.186.173	2.614.279.277
7684	4.664.785.000	4.658.346.179	4.658.346.179	4.377.760.722	280.585.457
7696	9.245.692.000	9.220.635.808	9.220.635.808	7.508.776.274	1.711.859.534
7698	23.664.095.000	23.511.665.944	23.514.040.919	23.010.724.981	503.315.938
7703	67.394.878.000	61.456.510.243	61.456.510.243	20.798.943.374	40.657.566.869
<b>Total CV</b>	<b>118.190.295.026</b>	<b>111.754.623.624</b>	<b>111.756.998.599</b>	<b>65.989.391.524</b>	<b>45.767.607.075</b>

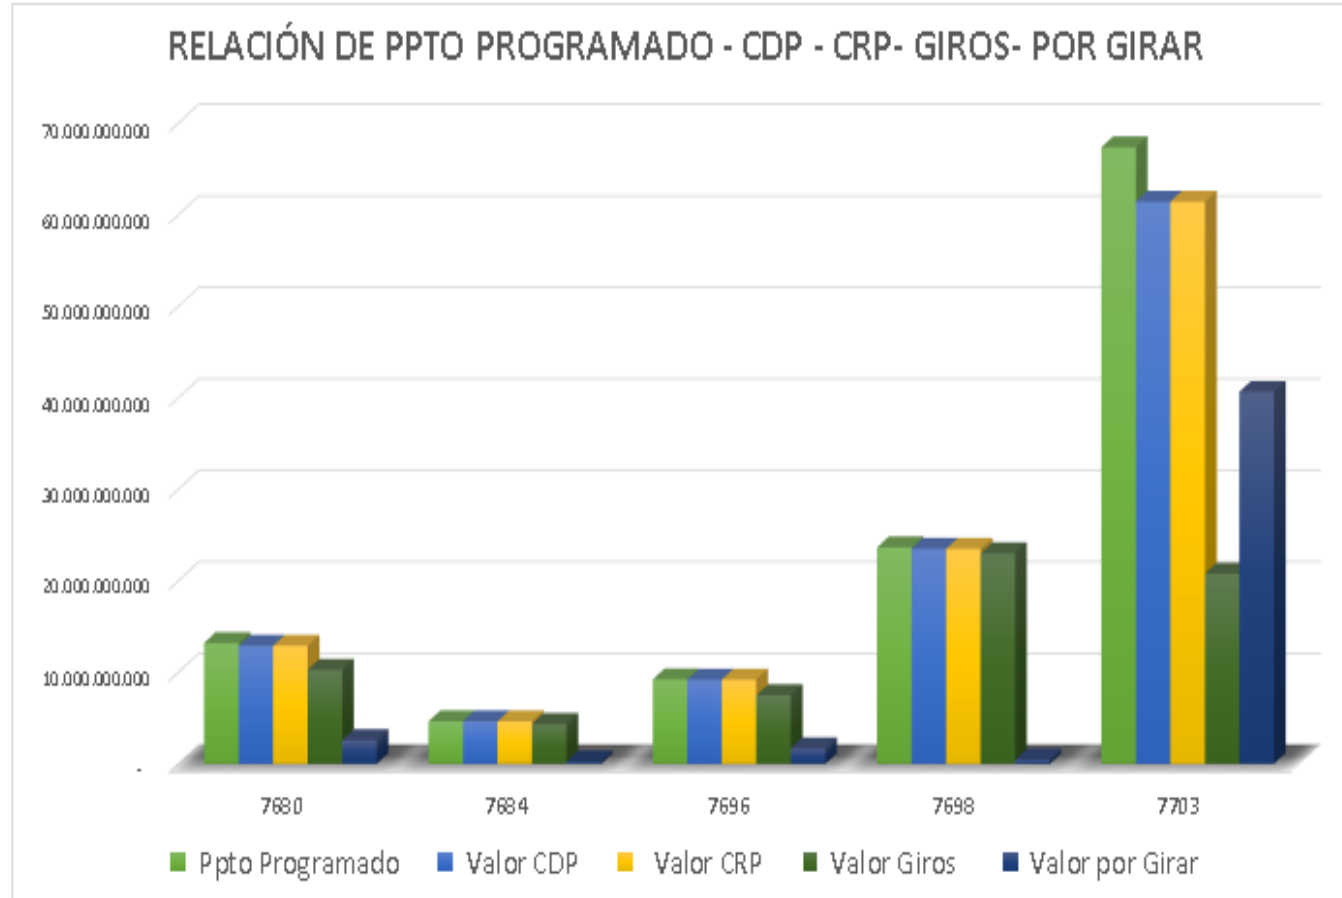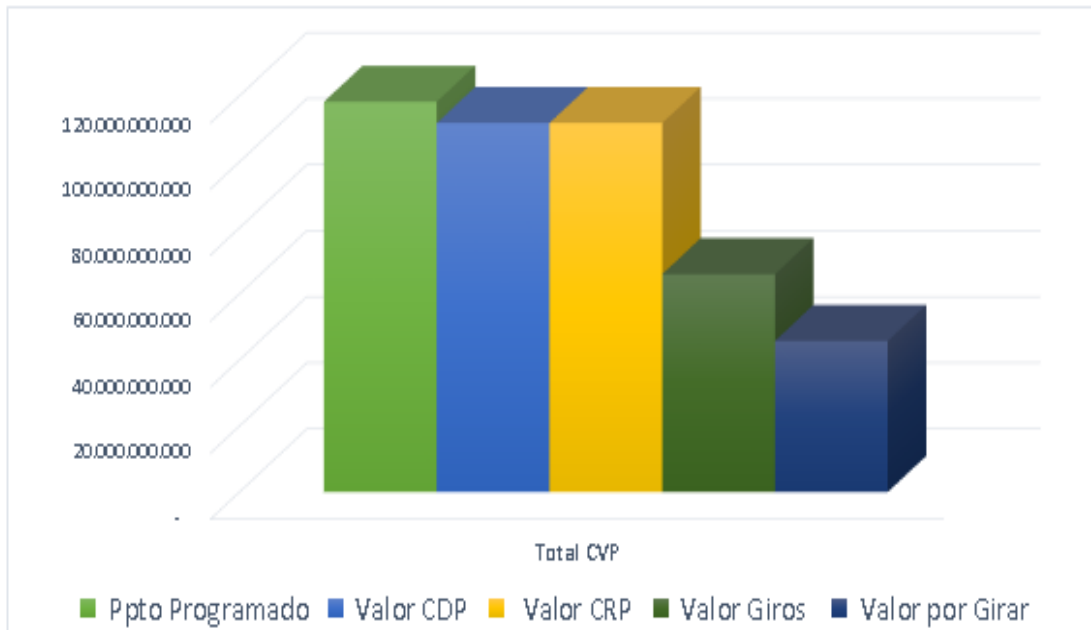

## AVANCE PLAN DE ACTIVIDADES

Proyecto	Meta Proyecto o de Inversión	Prog 2020	Eje 2020	% eje 2020	Prog 2021	Eje diciembre 2021	% eje diciembre 2021
7680	Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.	20%	20%	100%	45%	40,75%	83,0%
	Expedir 1.500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.	50	50	100%	250	250	100,00%
	Estructurar 1.250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).	20	20	100%	300	280	93,33%
	Ejecutar 1.250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.	0	0	0	143	0	0,00%
	Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones necesarias para el inicio de las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.	0	0	0	406	406	100,00%
7703	Construir 107.000 m2 de espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1	17.305,60	17.000	98.23%	15.000	14.571,12	97,14%
	Ejecutar 100 % de la Estructuración, formulación y seguimiento del proyecto	100%	97	97%	100%	97,25%	97,25%
7684	Obtener 2.400 títulos de predios registrados	300	433	144.33%	900	1005	111,67%
	Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP	1	1	1	0,35	0,35	100,00%
	Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	1	1	1	1	1	100,00%

## AVANCE PLAN DE ACTIVIDADES

Proyecto	Meta Proyecto o de Inversión	Prog 2020	Eje 2020	% eje 2020	Prog 2021	Eje diciembre 2021	% eje diciembre 2021
7698	Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	54	55	101.85%	217	207	95.39%
	Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	28	27	96.43%	36	37	102.78%
	Beneficiar 1.850 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria.	1497	1484	99.13%	1598	1588	99.37%
	Beneficiar 1.749 hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva.	0	0	0	795	797	100.25%
	Gestionar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020.	0	0	0	100%	100.00%	100.00%
7696	Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	10%	10%	100%	25%	25.00%	100.00%
	Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.	10%	10%	100%	25%	25.00%	100.00%
	Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".	1.5	1.5	100%	3.75	3.75	100.00%
	Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	0	0	0	35%	35.00%	100.00%
	Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.	5%	5%	100%	13%	12.50%	100.00%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PI 7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio.


Dirección de Mejoramiento de Vivienda

  
**BOGOTÁ**  
Caja de la Vivienda  
Popular




<b>VALOR TOTAL 2021</b>		<b>13.220.845.026</b>
<b>Ejecución a diciembre</b>	<b>97,63%</b>	<b>12.907.465.450</b>
<b>Sin comprometer</b>	<b>2,37%</b>	<b>313.379.576</b>

<b>Total Reservas PI - 2021</b>		<b>2.139.442.830</b>
<b>BMT</b>	0,75%	16.001.462
<b>UNCSAB</b>	99,25%	2.123.441.368
<b>Girado a diciembre</b>	<b>98,34%</b>	<b>2.103.834.804</b>
<b>Por girar</b>	<b>1,66%</b>	<b>35.608.026</b>

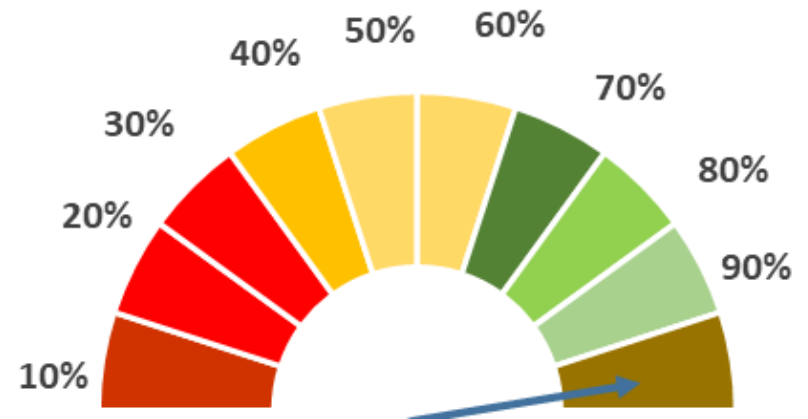

Ejecución vigencia – diciembre 2021

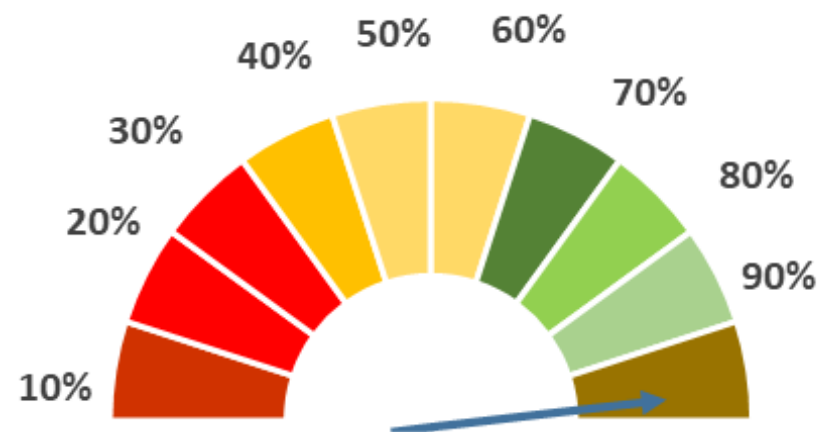

Giros reservas –diciembre 2021 / reservas BMT + UNCSAB

CDP	CRP	GIROS
12.907.465.450	12.907.465.450	10.293.186.173
97,63%	97,63%	77,86%

### Pasivos exigibles

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2020	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar diciembre 2021
Dirección Mejoramiento de Vivienda	0	0	0	0

Curaduría Pública Social


Reciba apoyo técnico para la legalización de su construcción, es gratuito!

## PLAN TERRAZAS

Curaduría Pública Social

Licencias y Actos Administrativos Ejecutorios


## Meta PDD 2020 – 2024: 124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas

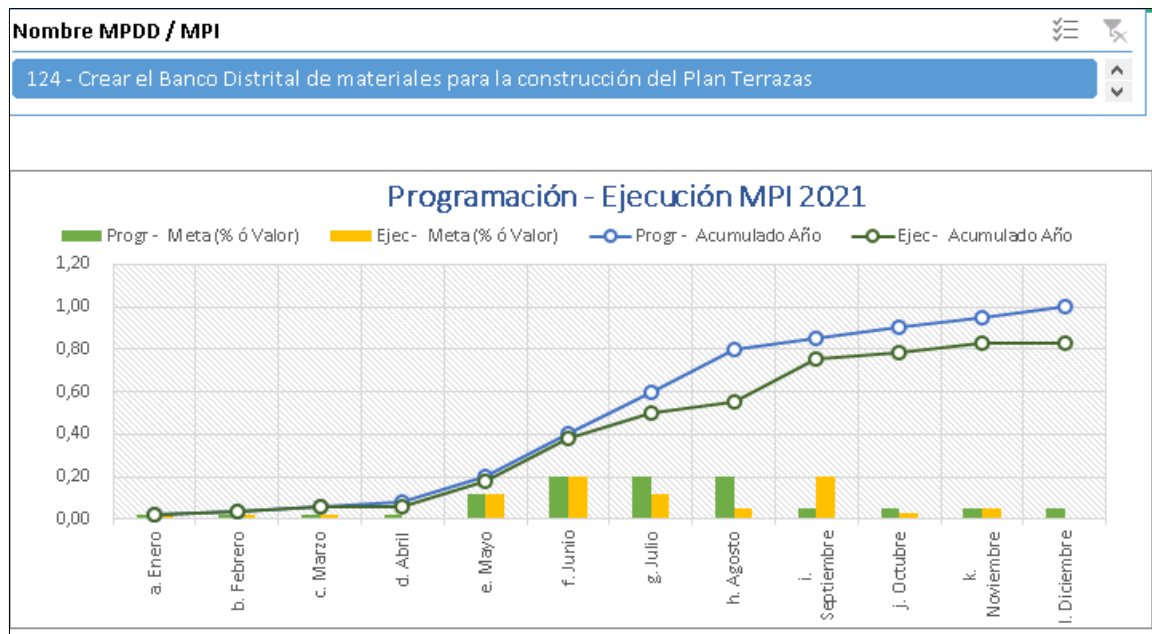

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0%
Febrero	2,0%	4,0%	2,0%	4,0%	0%
Marzo	2,0%	6,0%	2,0%	6,0%	0%
Abril	2,0%	8,0%	0,0%	6,0%	-33%
Mayo	12,0%	20,0%	12,0%	18,0%	-11%
Junio	20,0%	40,0%	20,0%	38,0%	-5%
Julio	20,0%	60,0%	12,0%	50,0%	-20%
Agosto	20,0%	80,0%	5,0%	55,0%	-45%
Septiembre	5,0%	85,0%	20,0%	75,0%	-13%
Octubre	5,0%	90,0%	3,0%	78,0%	-15%
Noviembre	5,0%	95,0%	5,0%	83,0%	-14%
Diciembre	5,0%	100,0%	0,0%	83,0%	-20%
	<b>100%</b>		<b>83%</b>	<b>83%</b>	




PI / MPI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% Ejec
7680						
124	2.986.400.000	2.978.800.000	2.978.800.000	2.924.333.333	54.466.667	99,7%

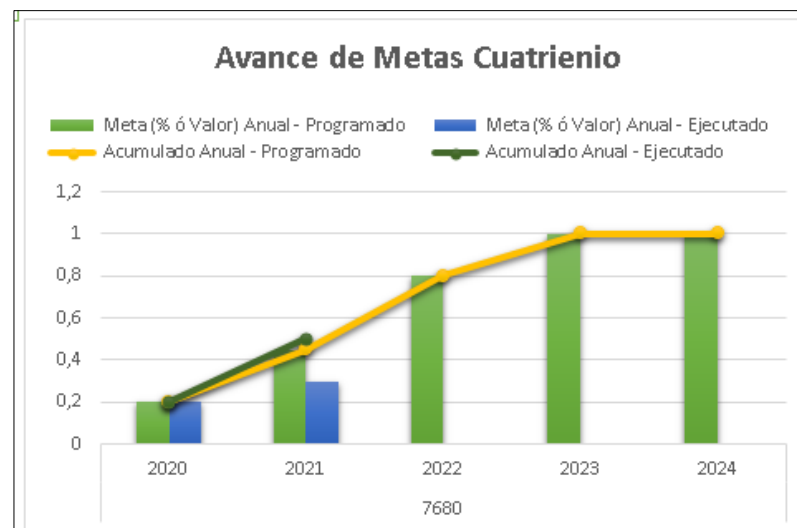



AÑO	PROG Meta
2020	20,0%
2021	45,0%
2022	80,0%
2023	100,0%
2024	100,0%

## Meta PDD 2020 – 2024: 124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas

*MPI: 124-1. Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.*

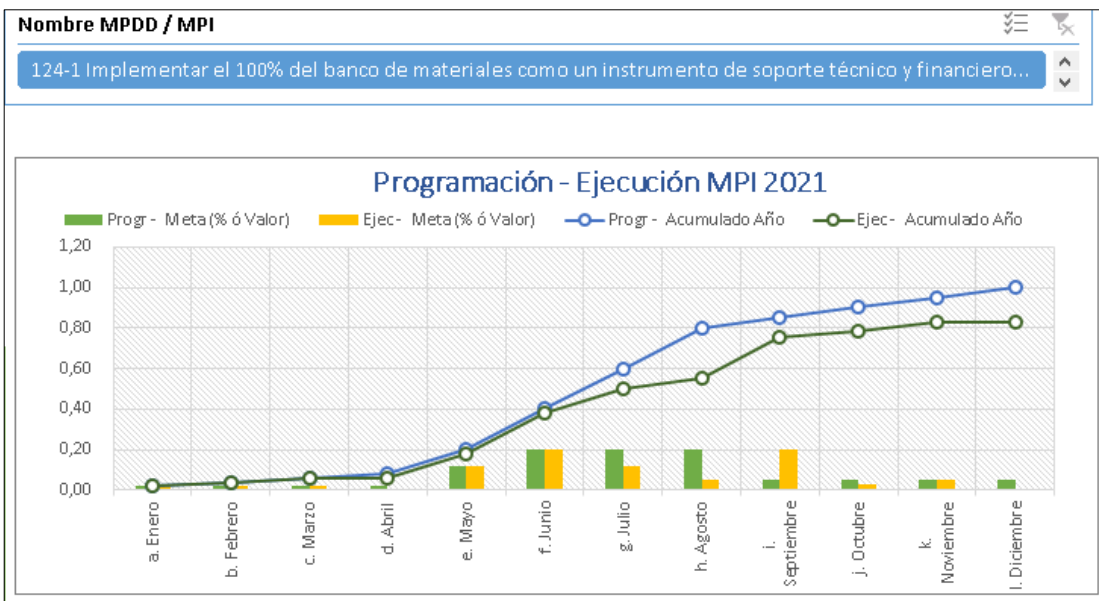

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0%
Febrero	2,0%	4,0%	2,0%	4,0%	0%
Marzo	2,0%	6,0%	2,0%	6,0%	0%
Abril	2,0%	8,0%	0,0%	6,0%	-33%
Mayo	12,0%	20,0%	12,0%	18,0%	-11%
Junio	20,0%	40,0%	20,0%	38,0%	-5%
Julio	20,0%	60,0%	12,0%	50,0%	-20%
Agosto	20,0%	80,0%	5,0%	55,0%	-45%
Septiembre	5,0%	85,0%	20,0%	75,0%	-13%
Octubre	5,0%	90,0%	3,0%	78,0%	-15%
Noviembre	5,0%	95,0%	5,0%	83,0%	-14%
Diciembre	5,0%	100,0%	0,0%	83,0%	-20%
	<b>100%</b>		<b>83%</b>	<b>83%</b>	

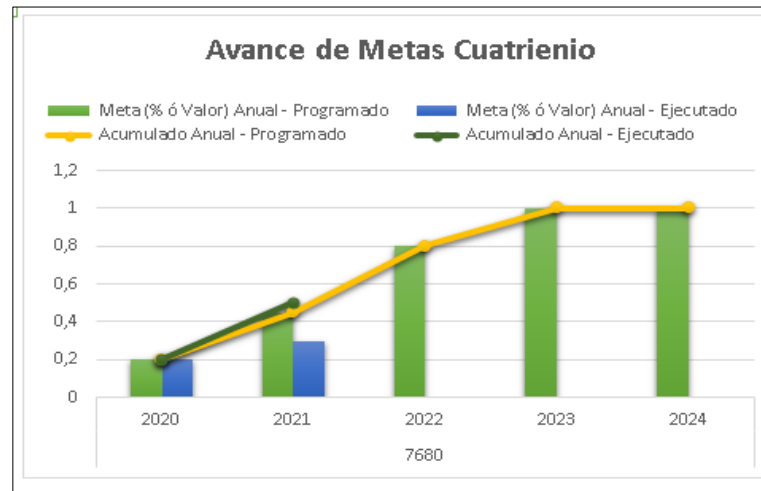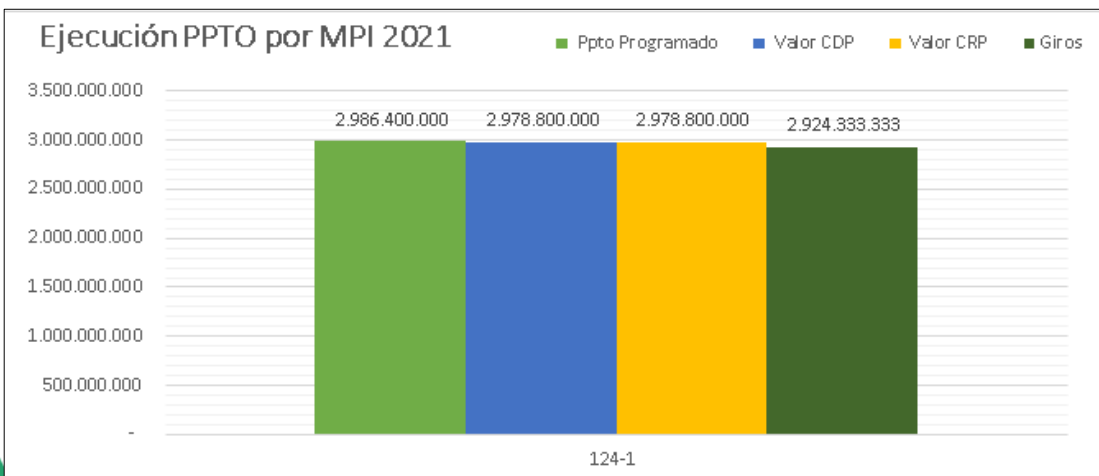

AÑO	Meta
2020	20,0%
2021	45,0%
2022	80,0%
2023	100,0%
2024	100,0%


## Meta PDD 2020 – 2024: 125. Crear una curaduría pública social

Nombre MPDD / MPI

125 - Crear una curaduría pública social.

Programación - Ejecución MPI 2021

■ Progr - Meta (% ó Valor)   
 ■ Ejec - Meta (% ó Valor)   
 ● Progr - Acumulado Año   
 ● Ejec - Acumulado Año

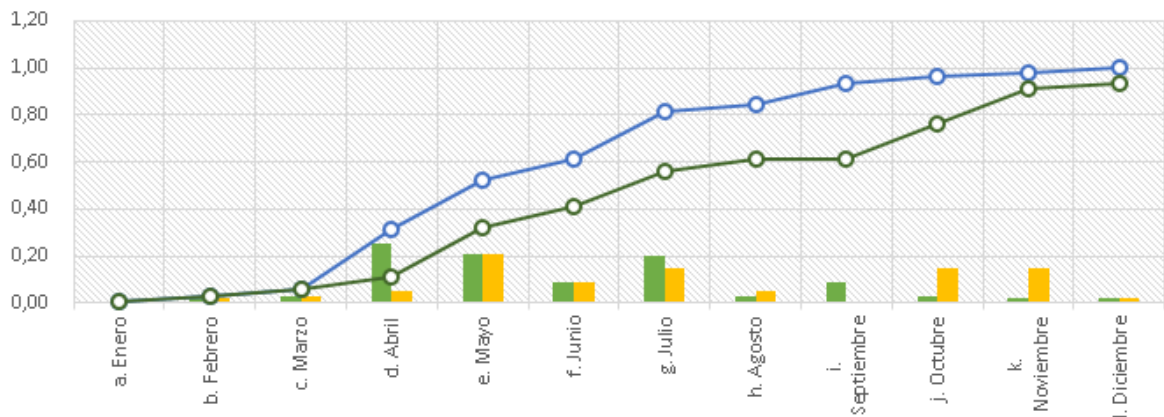


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0%
Febrero	2,0%	3,0%	2,0%	3,0%	0%
Marzo	3,0%	6,0%	3,0%	6,0%	0%
Abril	25,0%	31,0%	5,0%	11,0%	-182%
Mayo	21,0%	52,0%	21,0%	32,0%	-63%
Junio	9,0%	61,0%	9,0%	41,0%	-49%
Julio	20,0%	81,0%	15,0%	56,0%	-45%
Agosto	3,0%	84,0%	5,0%	61,0%	-38%
Septiembre	9,0%	93,0%	0,0%	61,0%	-52%
Octubre	3,0%	96,0%	15,0%	76,0%	-26%
Noviembre	2,0%	98,0%	15,0%	91,0%	-8%
Diciembre	2,0%	100,0%	2,0%	93,0%	-8%
	<b>100%</b>		<b>93%</b>	<b>93%</b>	

PI / MPI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% Ejec
7680						
125	3.932.276.784	3.805.545.813	3.805.545.813	2.651.072.101	1.154.473.712	96,8%



Avance de Metas Cuatrienio

■ Meta (% ó Valor) Anual - Programado  
■ Meta (% ó Valor) Anual - Ejecutado

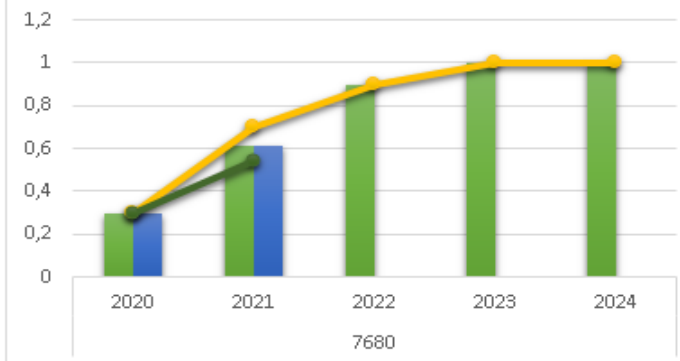


AÑO	PROG Meta
2020	30%
2021	70%
2022	90%
2023	100%
2024	100%





## Meta PDD 2020 – 2024: 125. Crear una curaduría pública social

**MPI: 125-1. Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.**

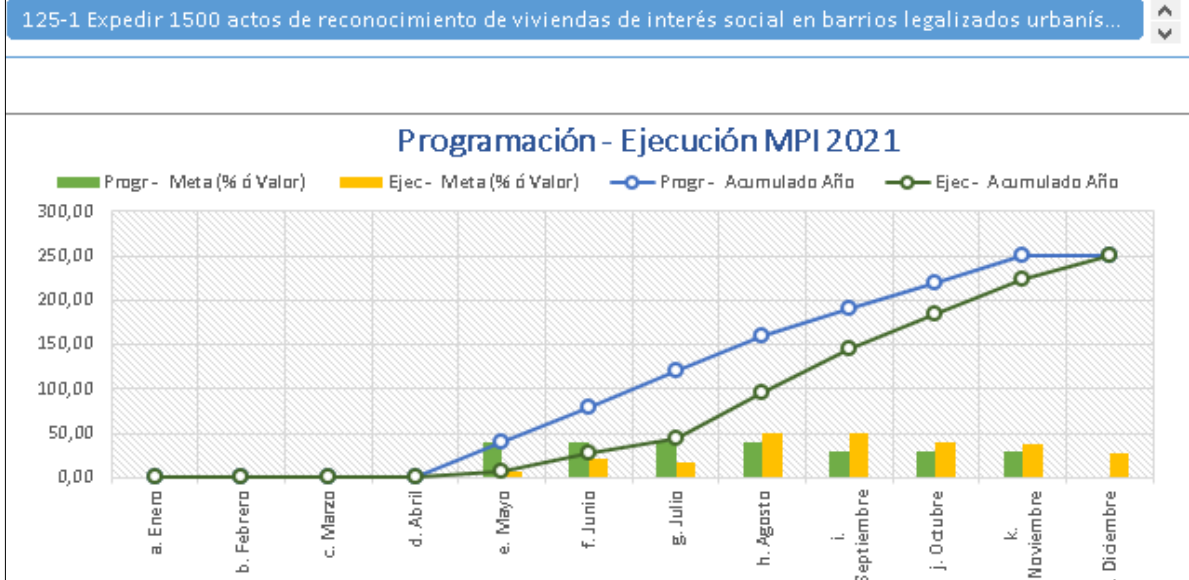

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mayo	40,00	40,00	6,00	6,00	-566,7%
Junio	40,00	80,00	22,00	28,00	-185,7%
Julio	40,00	120,00	17,00	45,00	-166,7%
Agosto	40,00	160,00	50,00	95,00	-68,4%
Septiembre	30,00	190,00	50,00	145,00	-31,0%
Octubre	30,00	220,00	40,00	185,00	-18,9%
Noviembre	30,00	250,00	38,00	223,00	-12,1%
Diciembre	0,00	250,00	27,00	250,00	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>	

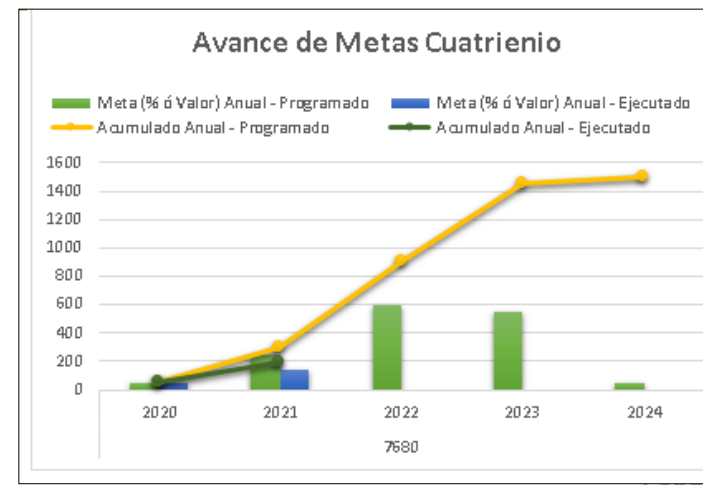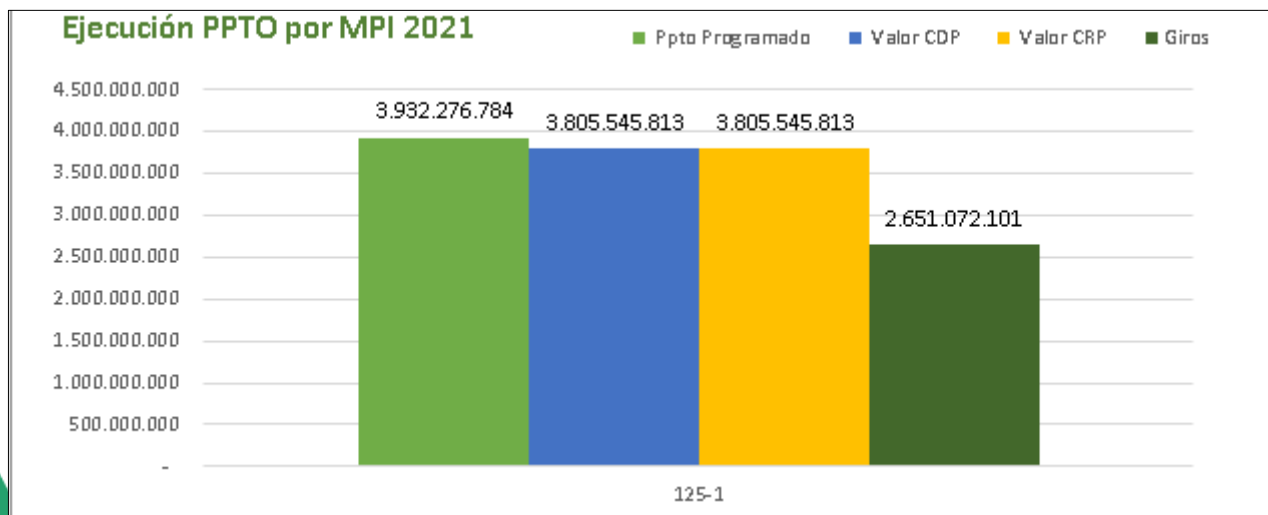


AÑO	PROG Meta
2020	50
2021	250
2022	600
2023	550
2024	50

Meta PDD 2020 – 2024: 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas

Nombre MPDD / MPI

129 - Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Pl..."

### Programación - Ejecución MPI 2021

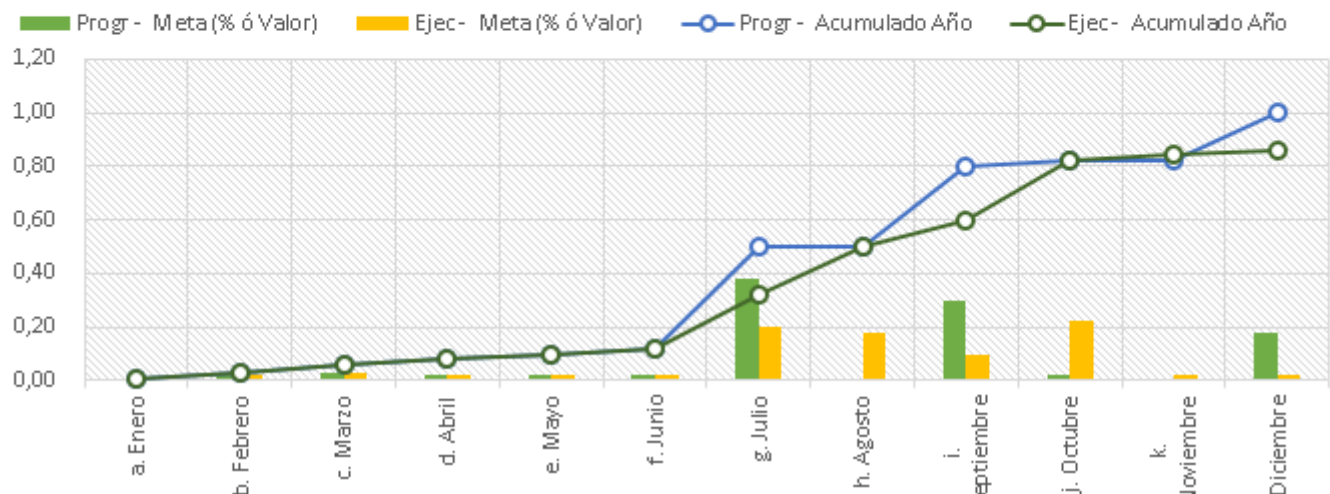


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0%
Febrero	2,0%	3,0%	2,0%	3,0%	0%
Marzo	3,0%	6,0%	3,0%	6,0%	0%
Abril	2,0%	8,0%	2,0%	8,0%	0%
Mayo	2,0%	10,0%	2,0%	10,0%	0%
Junio	2,0%	12,0%	2,0%	12,0%	0%
Julio	38,0%	50,0%	20,0%	32,0%	-56%
Agosto	0,0%	50,0%	18,0%	50,0%	0%
Septiembre	30,0%	80,0%	10,0%	60,0%	-33%
Octubre	2,0%	82,0%	22,0%	82,0%	0%
Noviembre	0,0%	82,0%	2,0%	84,0%	2%
Diciembre	18,0%	100,0%	2,0%	86,0%	-16%
	<b>100%</b>		<b>86%</b>	<b>86%</b>	

PI / MPI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% Ejec
7680						
129	6.302.168.242	6.123.119.637	6.123.119.637	4.717.780.739	1.405.338.898	97,2%




### Avance de Metas Cuatrienio

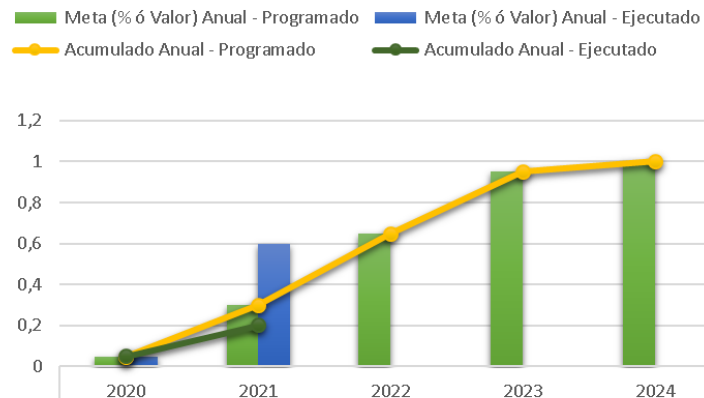



AÑO	PROG Meta
2020	5,0%
2021	30,0%
2022	65,0%
2023	95,0%
2024	100,0%

Meta PDD 2020 – 2024: 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas

*MPI: 129-1. Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).*

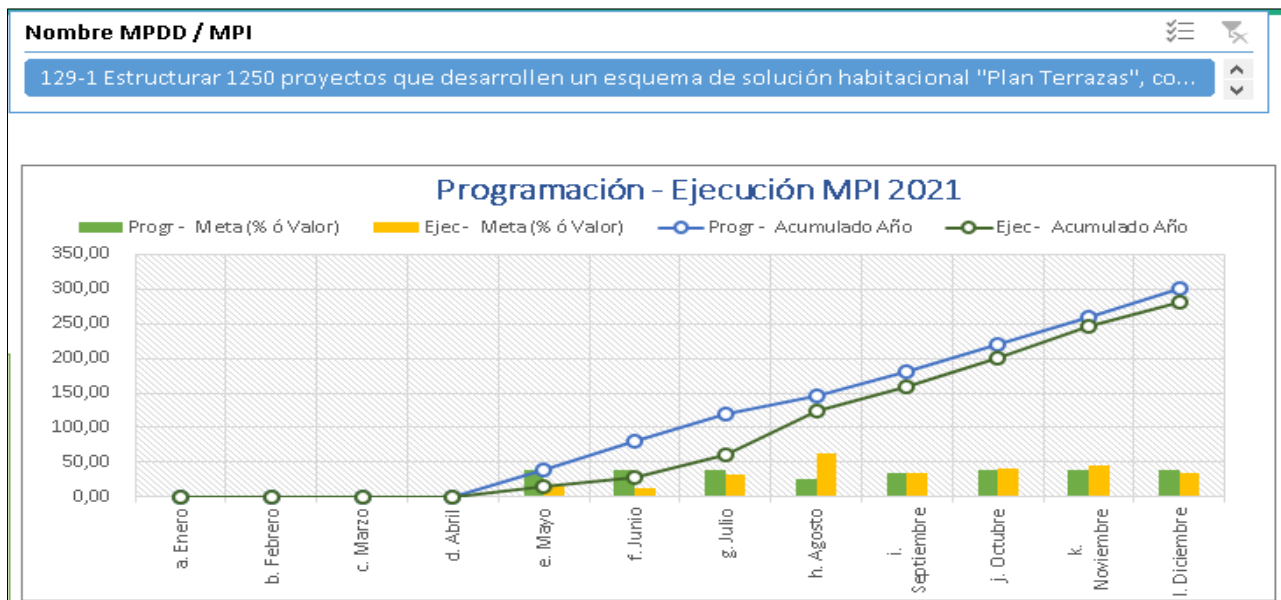

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0	0	0	0	
Febrero	0	0	0	0	
Marzo	0	0	0	0	
Abril	0	0	0	0	
Mayo	40	40	15	15	-167%
Junio	40	80	13	28	-186%
Julio	40	120	33	61	-97%
Agosto	26	146	63	124	-18%
Septiembre	34	180	35	159	-13%
Octubre	40	220	41	200	-10%
Noviembre	40	260	45	245	-6%
Diciembre	40	300	35	280	-7%
	<b>300</b>		<b>280</b>	<b>93%</b>	

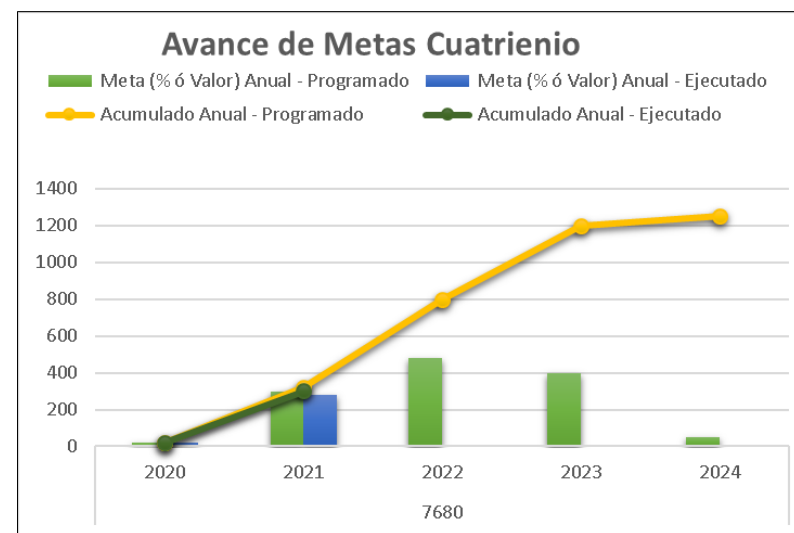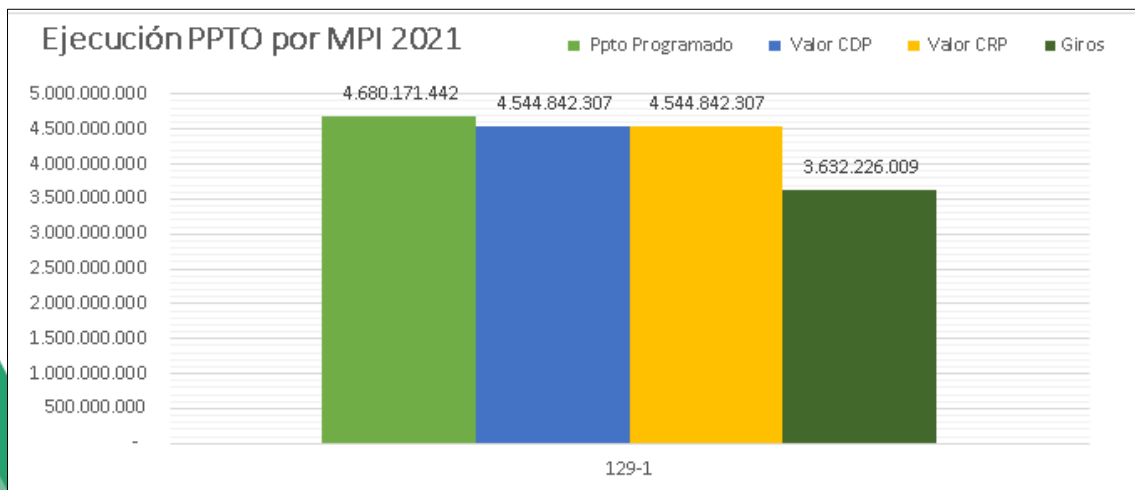



AÑO	PROG Meta
2020	20
2021	300
2022	480
2023	400
2024	50

Meta PDD 2020 – 2024: 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas

**MPI: 129-2. Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.**



Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0	0	0	0	
Febrero	0	0	0	0	
Marzo	0	0	0	0	
Abril	0	0	0	0	
Mayo	0	0	0	0	
Junio	0	0	0	0	
Julio	0	0	0	0	
Agosto	0	0	0	0	
Septiembre	0	0	0	0	
Octubre	0	0	0	0	
Noviembre	0	0	0	0	
Diciembre	143	143	0	0	
<b>Total</b>	<b>143</b>		-	<b>0%</b>	

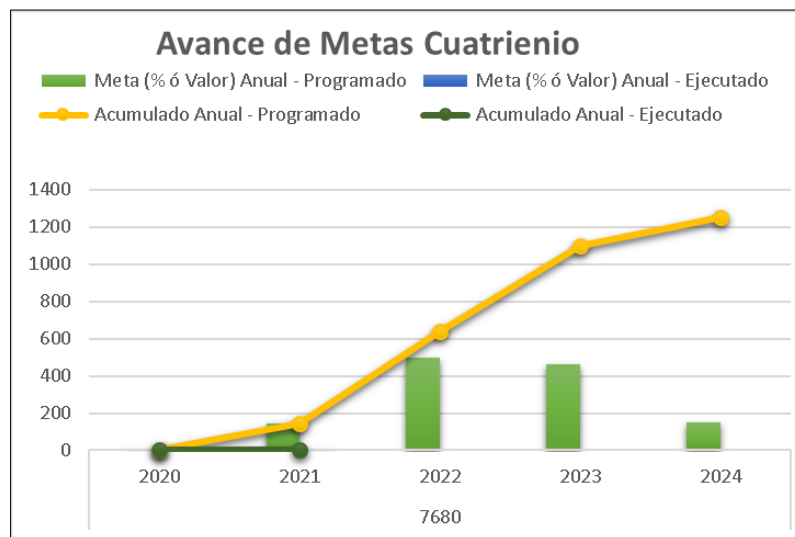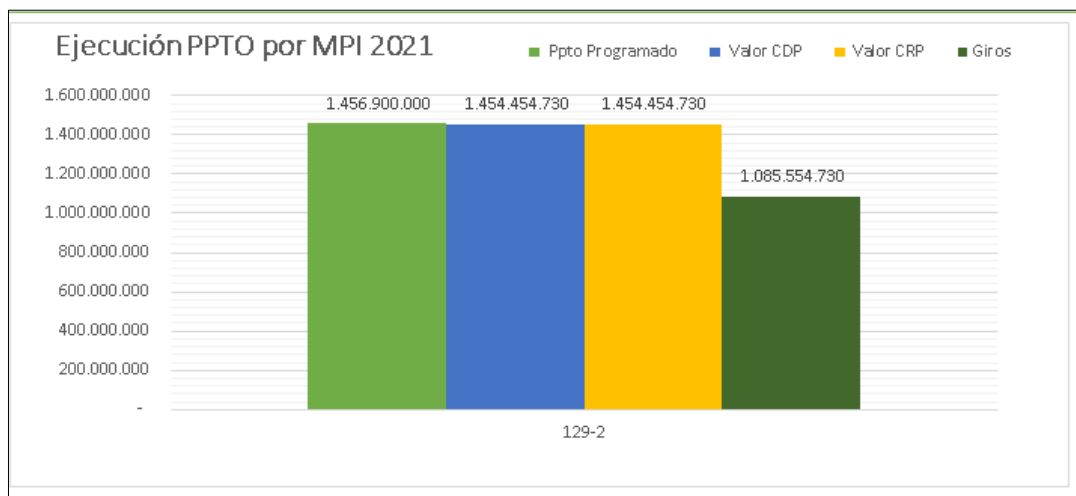


AÑO	PROG Meta
2020	-
2021	143
2022	497
2023	460
2024	150





Meta PDD 2020 – 2024: 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas

**MPI: 129-3 Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones necesarias para el inicio de las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.**

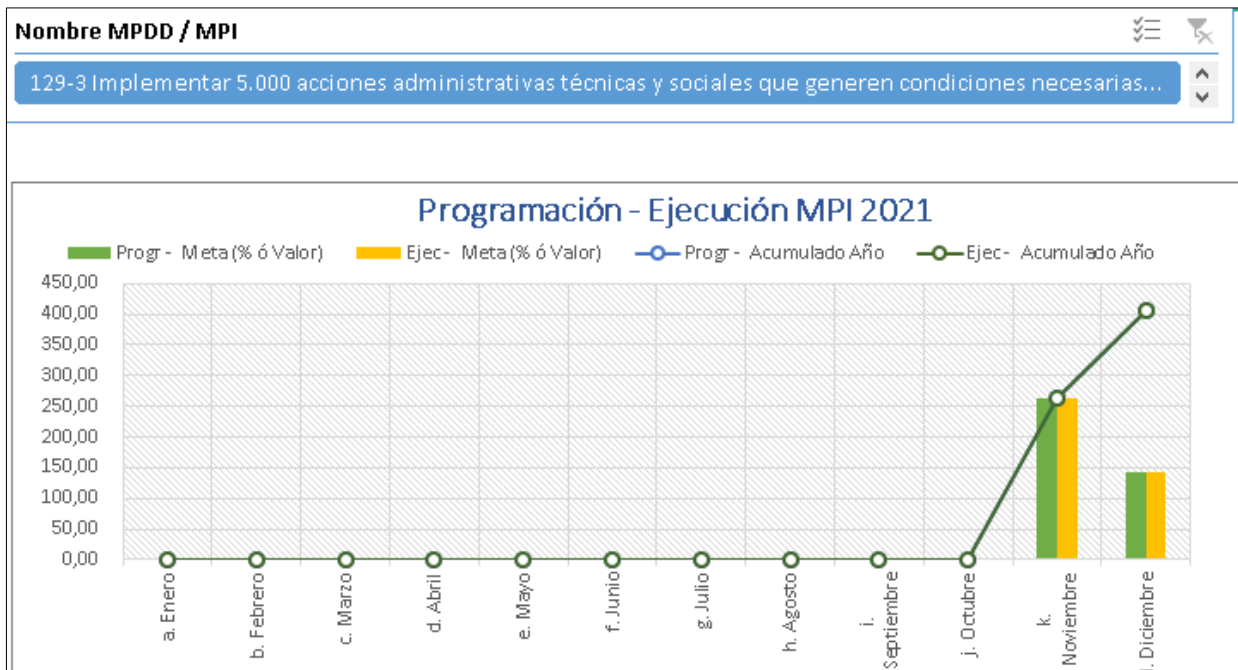

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0	0	0	0	
Febrero	0	0	0	0	
Marzo	0	0	0	0	
Abril	0	0	0	0	
Mayo	0	0	0	0	
Junio	0	0	0	0	
Julio	0	0	0	0	
Agosto	0	0	0	0	
Septiembre	0	0	0	0	
Octubre	0	0	0	0	
Noviembre	263	263	263	263	0%
Diciembre	143	406	143	406	0%
	<b>406</b>		<b>406</b>	<b>100%</b>	

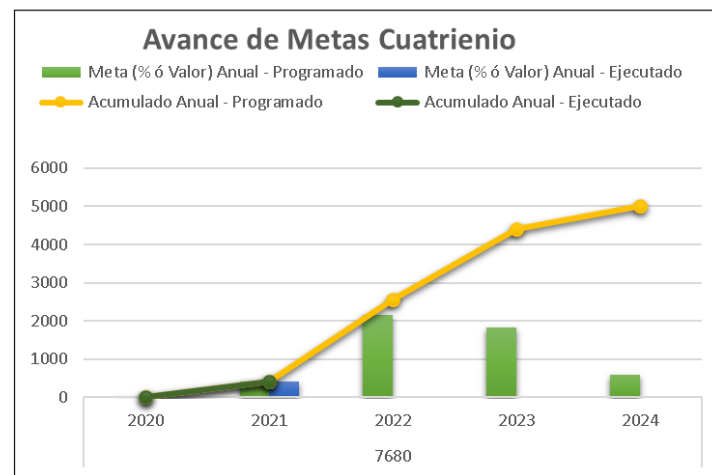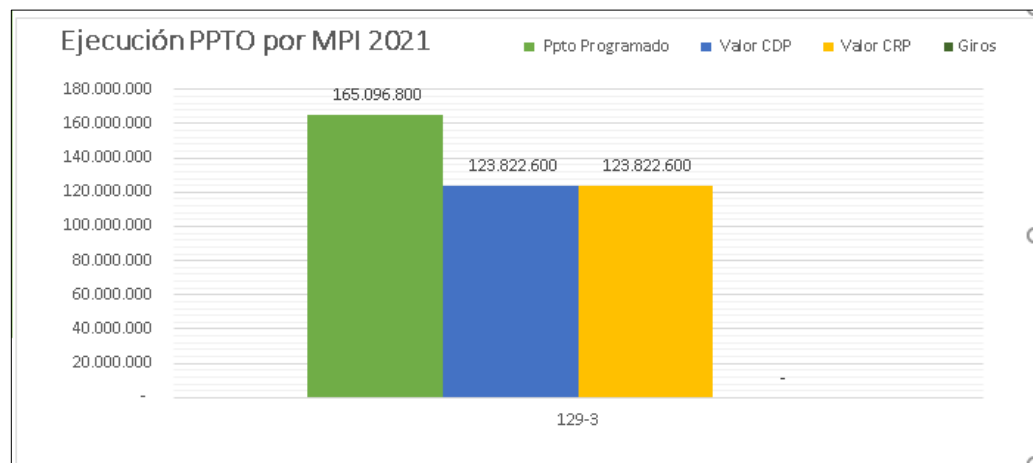

PROG	
AÑO	Meta
2020	-
2021	406
2022	2.154
2023	1.840
2024	600




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PI 7703- Mejoramiento integral de barrios con  
participación ciudadana Bogotá  
Dirección de Mejoramiento de Barrios



<b>VALOR TOTAL 2021</b>		<b>67.394.878.000</b>
<b>Ejecución a diciembre</b>	<b>91,19%</b>	<b>61.456.510.243</b>
<b>Sin comprometer</b>	<b>8,81%</b>	<b>5.938.367.757</b>

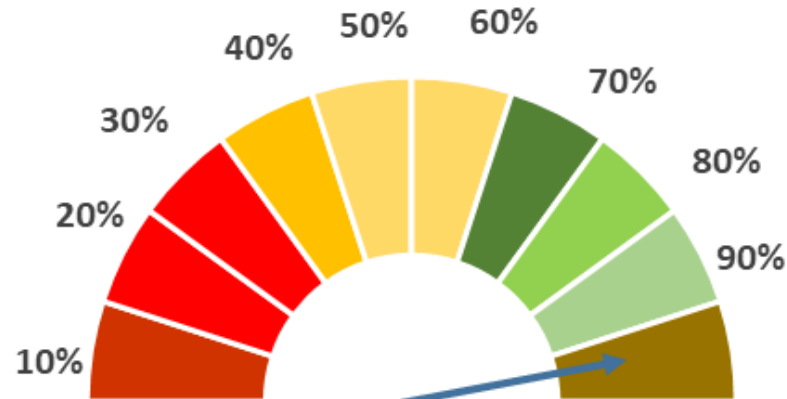


Ejecución vigencia – diciembre 2021

CDP	CRP	GIROS
61.456.510.243	61.456.510.243	20.798.943.374
91,19%	91,19%	30,86%



Mejoramiento de Barrios

<b>Total Reservas PI - 2021</b>		<b>4.349.950.017</b>
<b>BMT</b>	35,12%	1.527.727.812
<b>UNCSAB</b>	64,88%	2.822.222.205
<b>Girado a diciembre</b>	<b>97,85%</b>	<b>4.256.344.446</b>
<b>Por girar</b>	<b>2,15%</b>	<b>93.605.571</b>

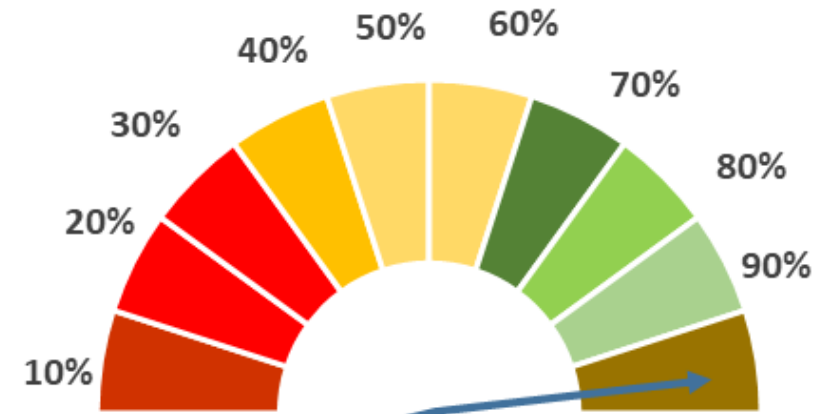

Giros reservas – diciembre 2021 / reservas BMT + UNCSAB


## Pasivos exigibles

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2020	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar diciembre 2021
Dirección de Mejoramiento de Barrios	1.243.475.545	552.401.314	278.351.884	412.722.347

**Meta PDD 2020 – 2024: 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios prioritizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)**



Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	-	-	-	-	
Febrero	-	-	-	-	
Marzo	-	-	-	-	
Abril	-	-	-	-	
Mayo	-	-	306	306	1.00
Junio	-	-	-	306	1.00
Julio	-	-	-	306	1.00
Agosto	-	-	-	306	1.00
Septiembre	-	-	-	306	1.00
Octubre	-	-	-	306	1.00
Noviembre	-	-	1,721	2,027	1.00
Diciembre	15,000	15,000	12,544	14,571	-3%
	<b>15,000</b>		<b>14,571</b>	<b>97%</b>	

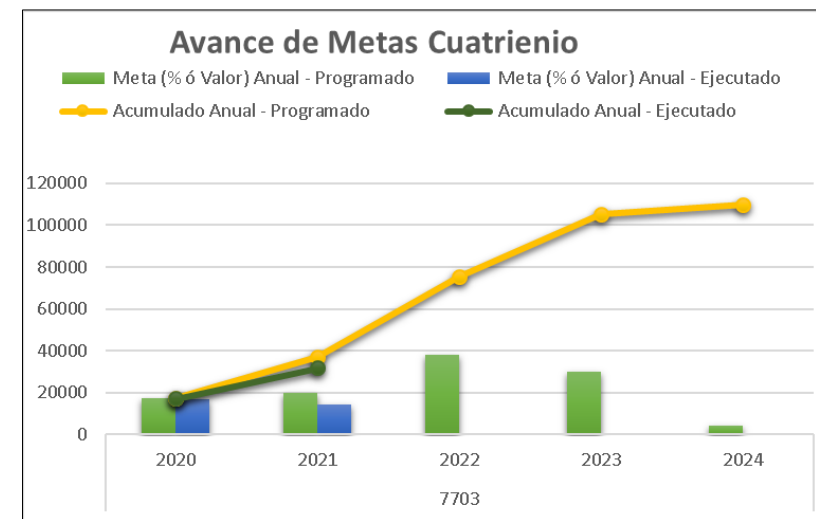


AÑO	PROG Meta
2020	17,306
2021	15,000
2022	44,000
2023	23,750
2024	6,944

PI / MPI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% Ejec
7703						
133	67.394.878.000	61.456.510.243	61.456.510.243	20.798.943.374	40.657.566.869	91,2%





Meta PDD 2020 – 2024: 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios prioritizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)

**MPI: 133-1. Construir 107.000 m2 de en espacio público en los territorios prioritizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo I.**

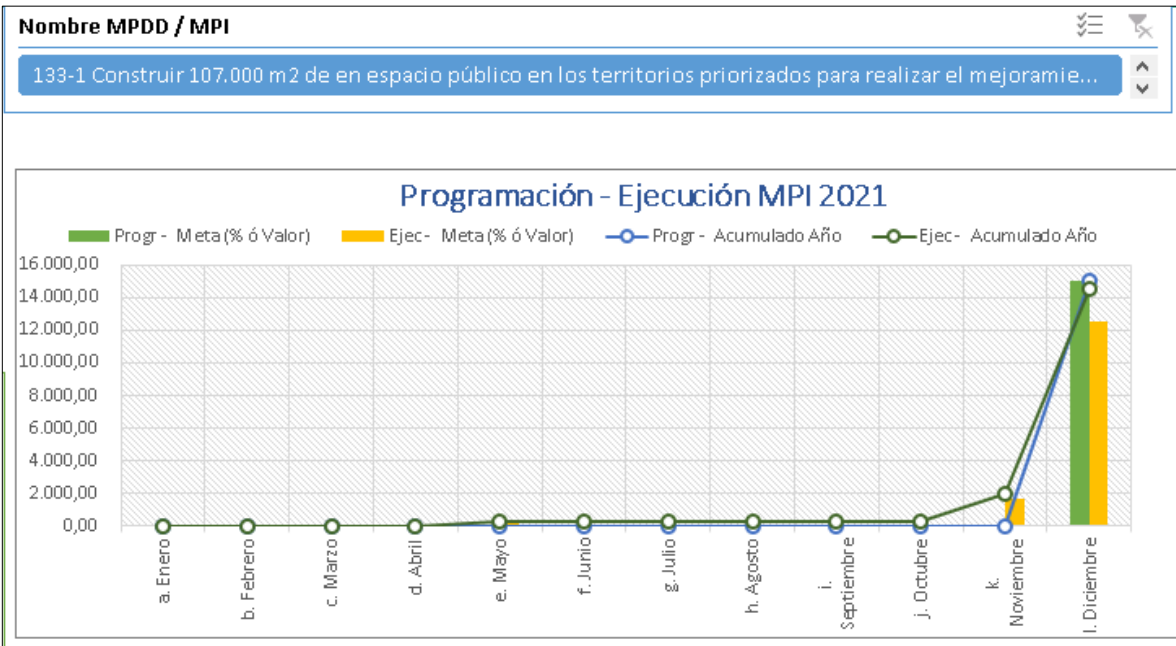

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	-	-	-	-	
Febrero	-	-	-	-	
Marzo	-	-	-	-	
Abril	-	-	-	-	
Mayo	-	-	306	306	1.00
Junio	-	-	-	306	1.00
Julio	-	-	-	306	1.00
Agosto	-	-	-	306	1.00
Septiembre	-	-	-	306	1.00
Octubre	-	-	-	306	1.00
Noviembre	-	-	1,721	2,027	1.00
Diciembre	15,000	15,000	12,544	14,571	-3%
<b>Total</b>	<b>15,000</b>		<b>14,571</b>	<b>97%</b>	

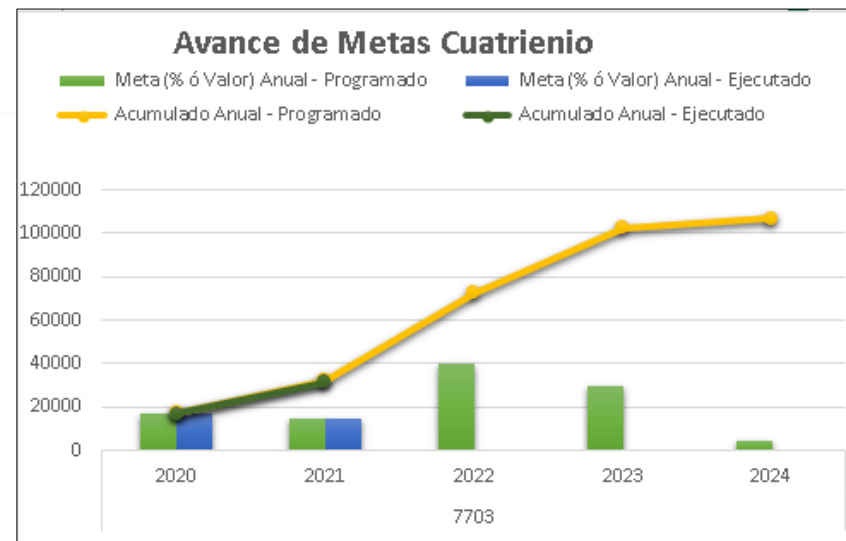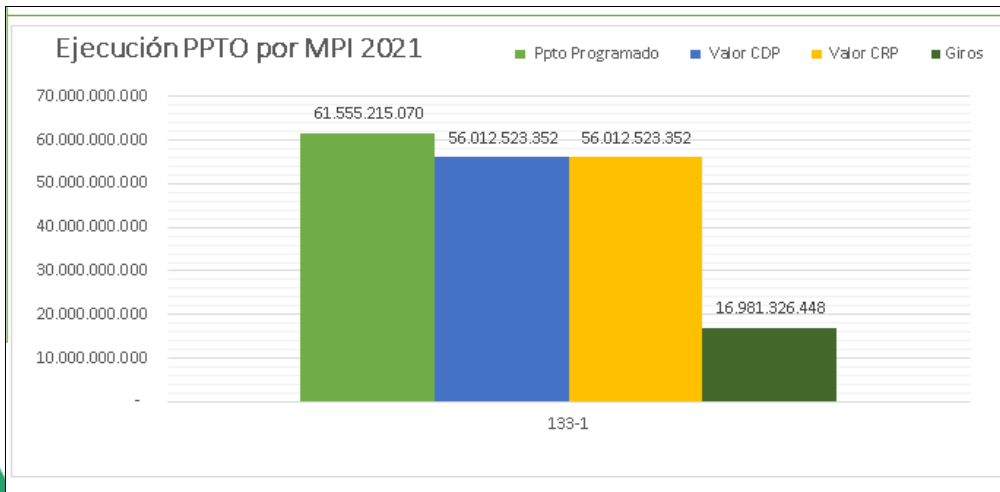

AÑO	PROG Meta
2020	17,306
2021	15,000
2022	44,000
2023	23,750
2024	6,944





Meta PDD 2020 – 2024: 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)


**MPI: 133-2. Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto**



Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	100%	100%	100%	8%	-1100%
Febrero	100%	100%	27%	11%	-845%
Marzo	100%	100%	130%	21%	-367%
Abril	100%	100%	58%	26%	-281%
Mayo	100%	100%	84%	33%	-201%
Junio	100%	100%	50%	37%	-167%
Julio	100%	100%	39%	41%	-146%
Agosto	100%	100%	100%	49%	-104%
Septiembre	100%	100%	247%	70%	-44%
Octubre	100%	100%	115%	79%	-26%
Noviembre	100%	100%	122%	89%	-12%
Diciembre	100%	100%	95%	97%	-3%
				<b>97%</b>	

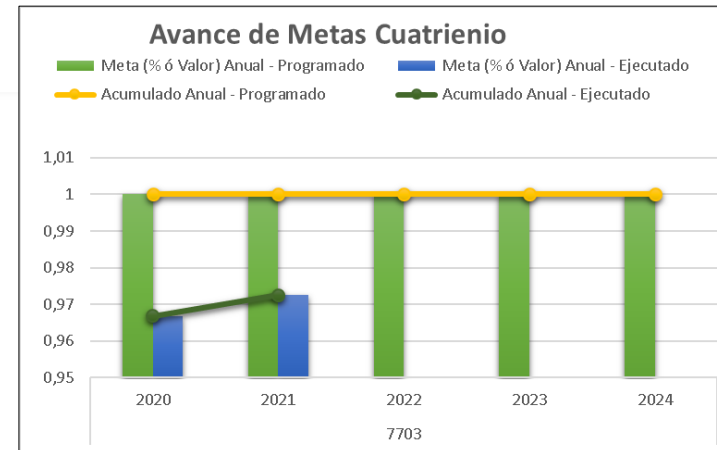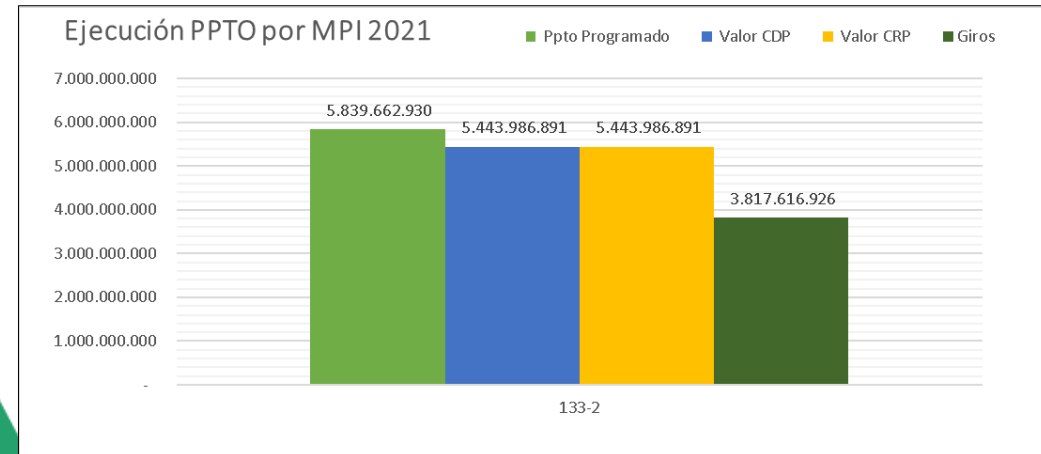

PROG	Meta
<b>AÑO</b>	<b>Meta</b>
2020	100%
2021	100%
2022	100%
2023	100%
2024	100%

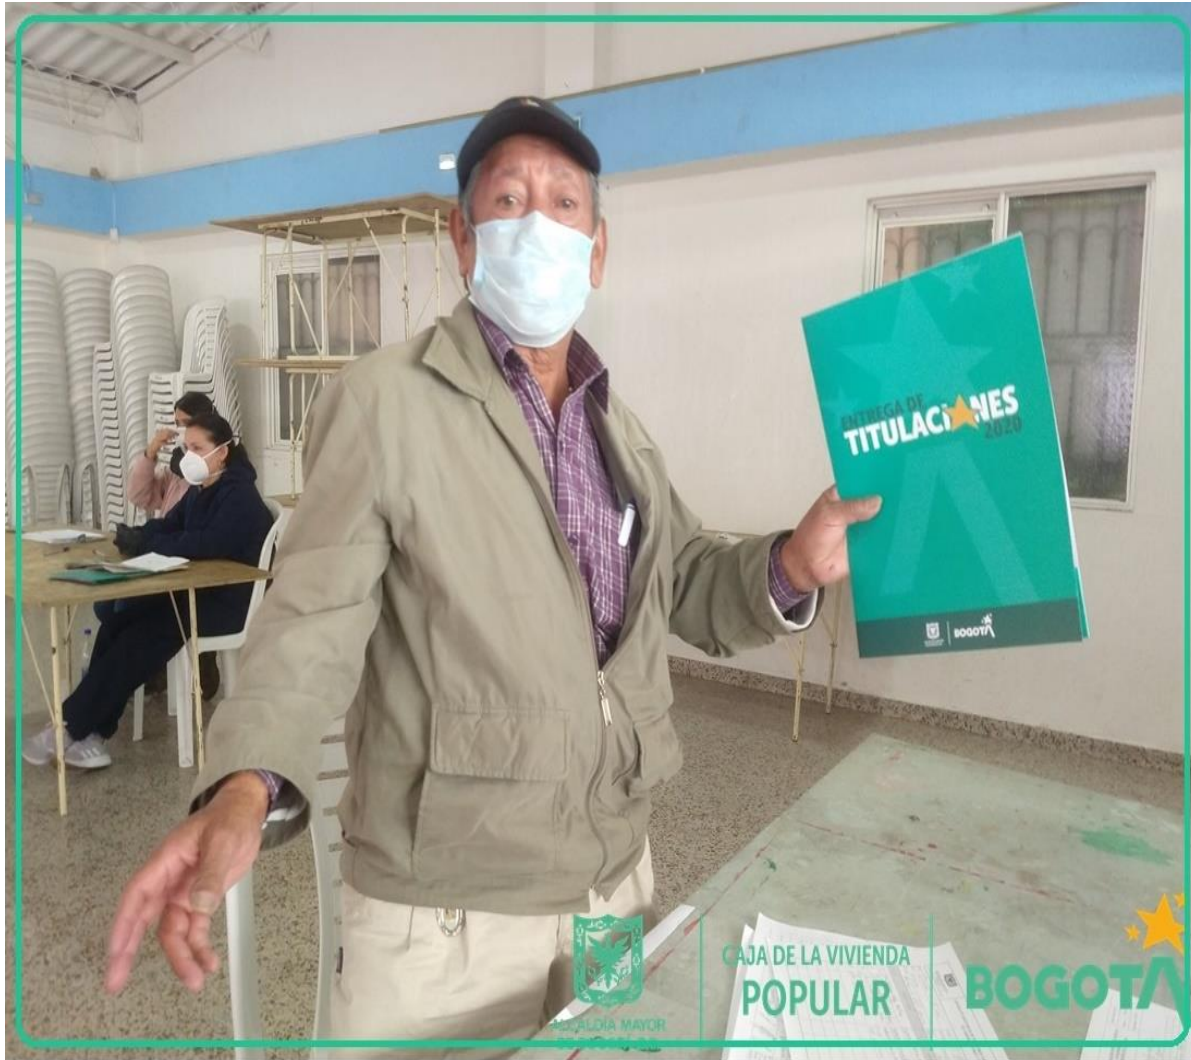

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento  
de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C.

Dirección de Urbanizaciones y Titulación




<b>VALOR TOTAL 2021</b>		<b>4.664.785.000</b>
<b>Ejecución a diciembre</b>	<b>99,86%</b>	<b>4.658.346.179</b>
<b>Sin comprometer</b>	<b>0,14%</b>	<b>6.438.821</b>

<b>Total Reservas PI - 2021</b>		<b>2.687.757.393</b>
<b>BMT</b>	0,78%	21.058.753
<b>UNCSAB</b>	99,22%	2.666.698.640
<b>Girado a diciembre</b>	<b>99,88%</b>	<b>2.684.612.391</b>
<b>Por girar</b>	<b>0,12%</b>	<b>3.145.002</b>

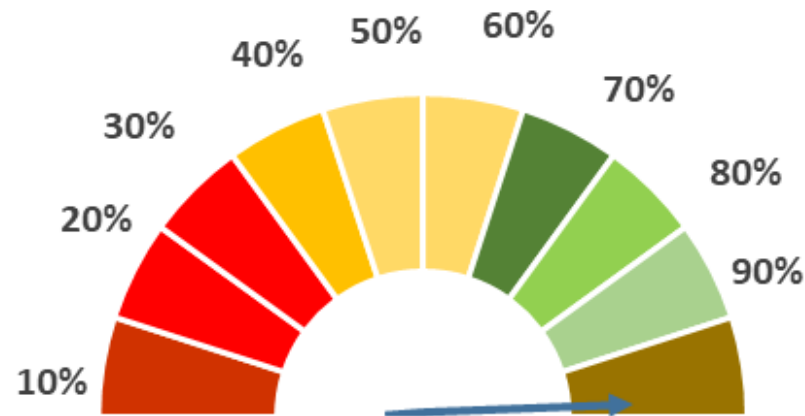

Ejecución vigencia – diciembre 2021

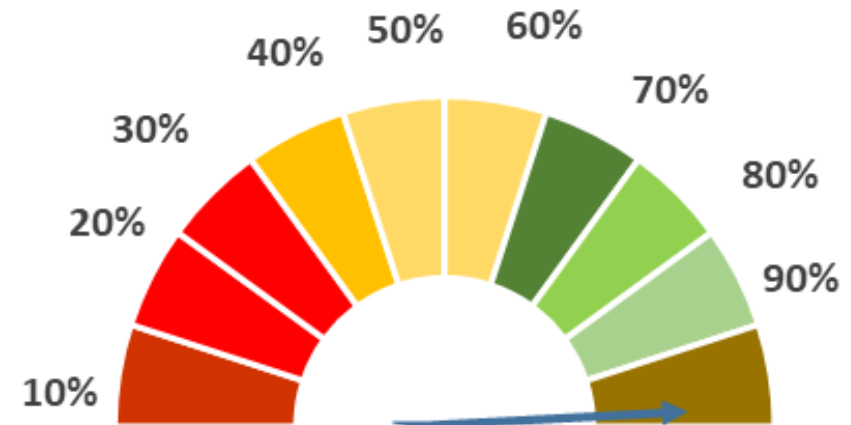

Giros reservas – diciembre 2021 / reservas BMT + UNCSAB

CDP	CRP	GIROS
4.658.346.179	4.658.346.179	4.377.760.722
99,86%	99,86%	93,85%


### Pasivos exigibles

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2020	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar diciembre 2021
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	109.244.711	1.823.567	107.421.144	0






## Meta PDD 2020 – 2024: 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades

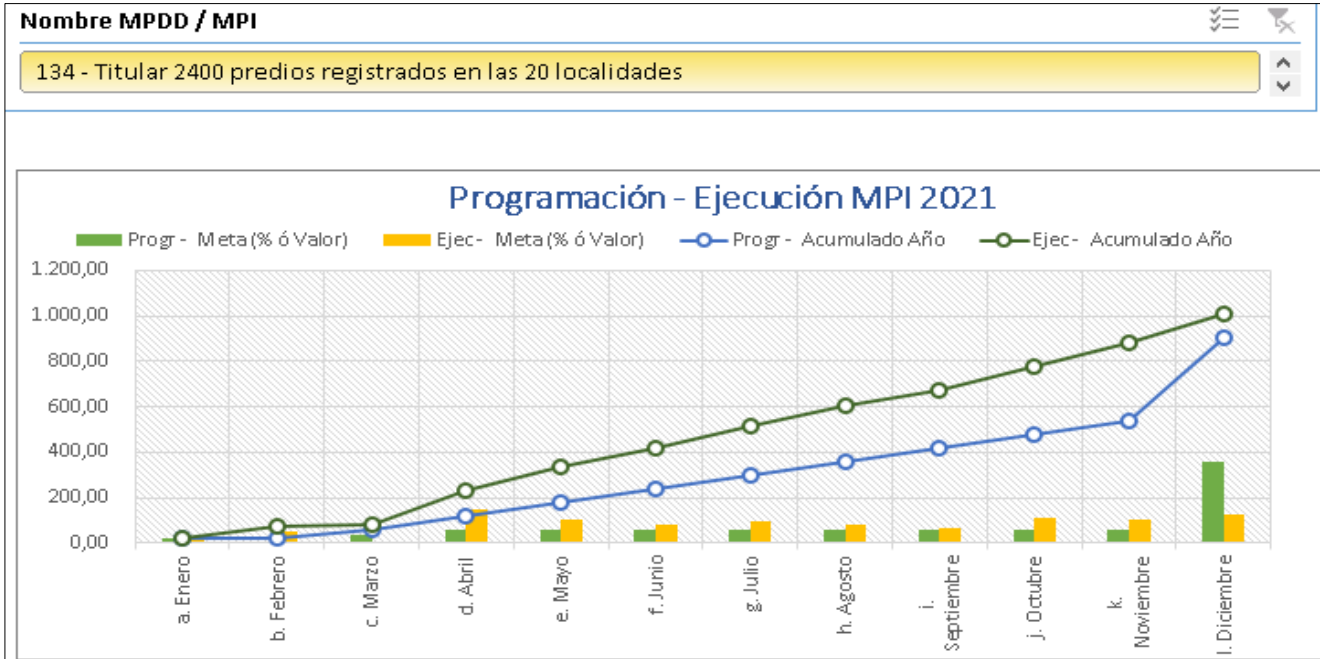

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	22,00	22,00	22,00	22,00	0%
Febrero	-	22,00	51,00	73,00	70%
Marzo	38,00	60,00	10,00	83,00	28%
Abril	60,00	120,00	151,00	234,00	49%
Mayo	60,00	180,00	102,00	336,00	46%
Junio	60,00	240,00	82,00	418,00	43%
Julio	60,00	300,00	100,00	518,00	42%
Agosto	60,00	360,00	85,00	603,00	40%
Septiembre	60,00	420,00	65,00	668,00	37%
Octubre	60,00	480,00	108,00	776,00	38%
Noviembre	60,00	540,00	105,00	881,00	39%
Diciembre	360,00	900,00	124,00	1.005,00	10%
	<b>900,00</b>		<b>1.005,00</b>	<b>112%</b>	


PI / MPI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% Ejec
7684						
134	4.664.785.000	4.658.346.179	4.658.346.179	4.377.760.722	280.585.457	99,9%

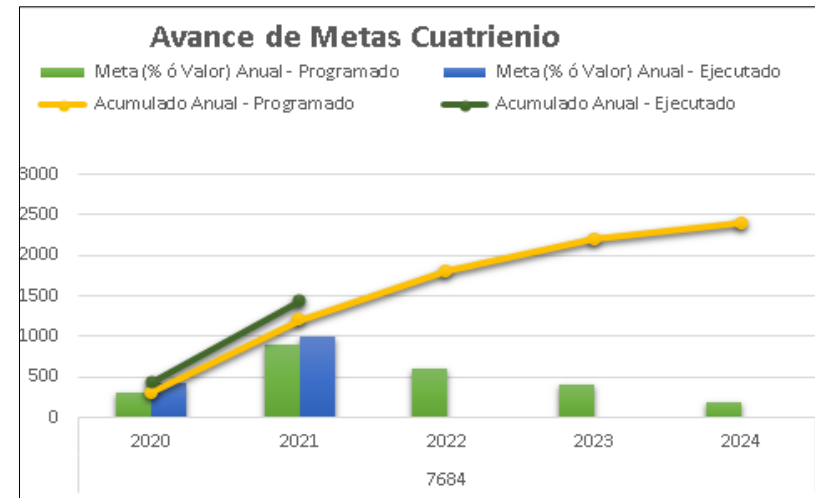

AÑO	PROG Meta
2020	300
2021	900
2022	600
2023	400
2024	200



Meta PDD 2020 – 2024: 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades

**MPI: 134-1. Obtener 2400 títulos predios registrados**

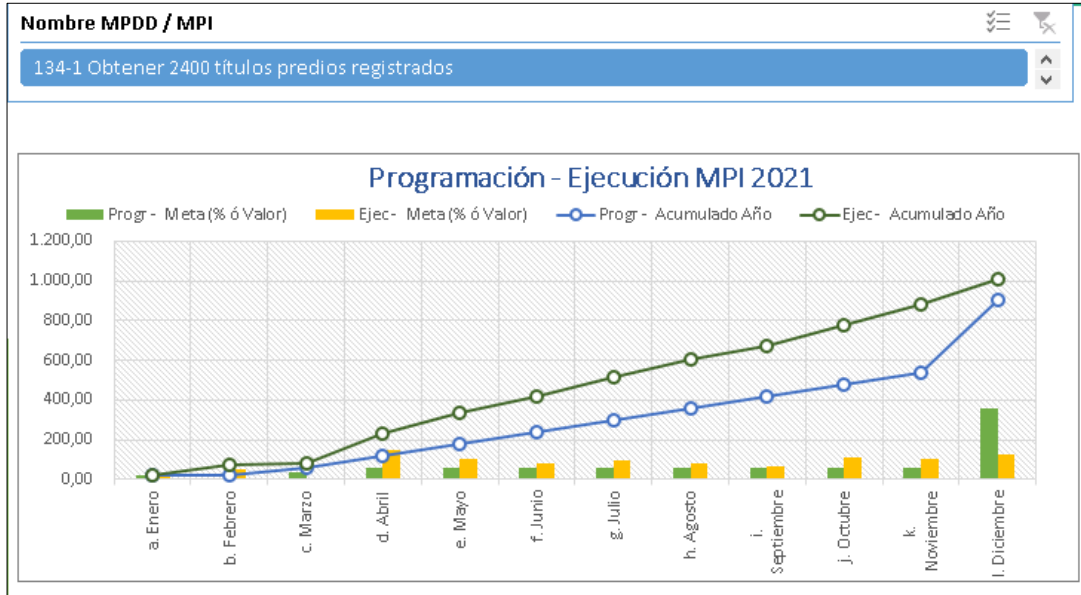

Urbanizaciones y Titulación


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	22,00	22,00	22,00	22,00	0%
Febrero	-	22,00	51,00	73,00	70%
Marzo	38,00	60,00	10,00	83,00	28%
Abril	60,00	120,00	151,00	234,00	49%
Mayo	60,00	180,00	102,00	336,00	46%
Junio	60,00	240,00	82,00	418,00	43%
Julio	60,00	300,00	100,00	518,00	42%
Agosto	60,00	360,00	85,00	603,00	40%
Septiembre	60,00	420,00	65,00	668,00	37%
Octubre	60,00	480,00	108,00	776,00	38%
Noviembre	60,00	540,00	105,00	881,00	39%
Diciembre	360,00	900,00	124,00	1.005,00	10%
<b>Total</b>	<b>900,00</b>		<b>1.005,00</b>	<b>112%</b>	

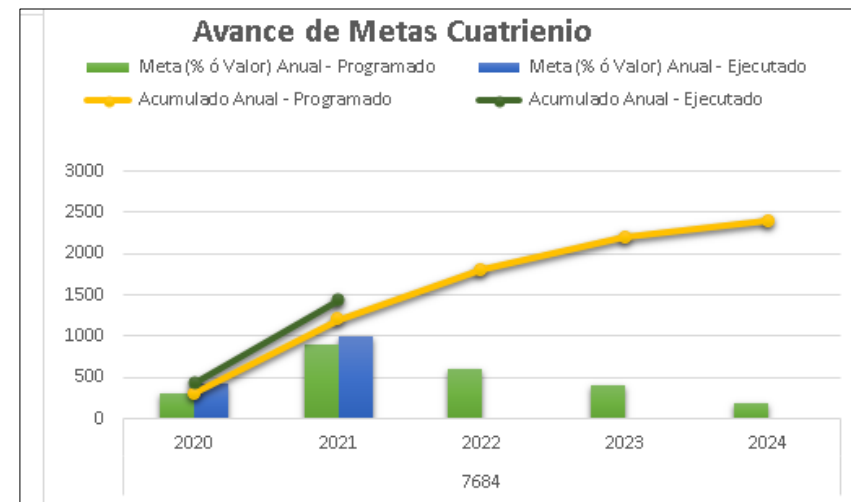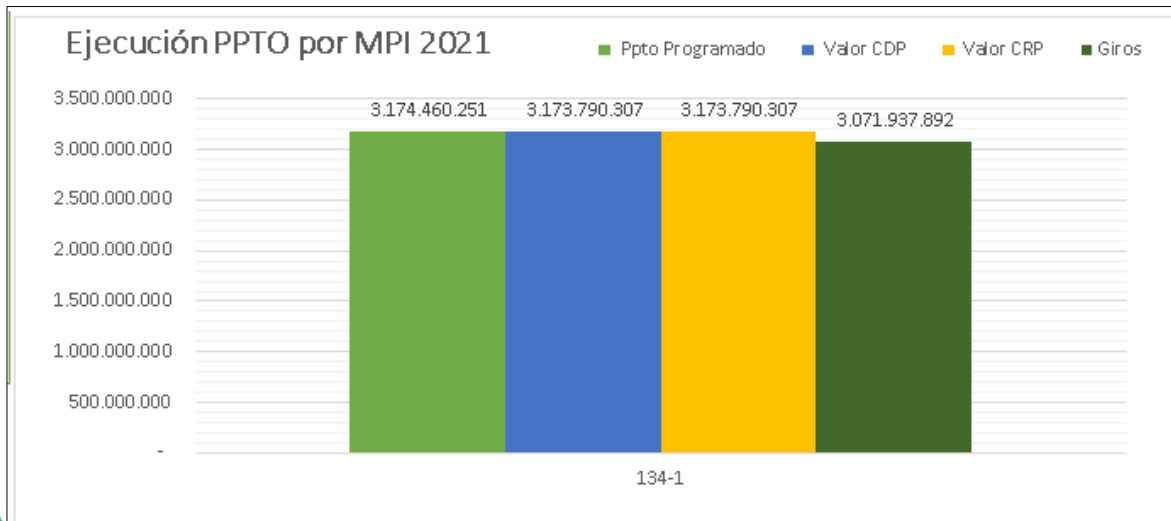


★ AÑO	PROG Meta
2020	300
2021	900
2022	600
2023	400
2024	200

Meta PDD 2020 – 2024: 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades

**MPI: 134-2. Hacer cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP**

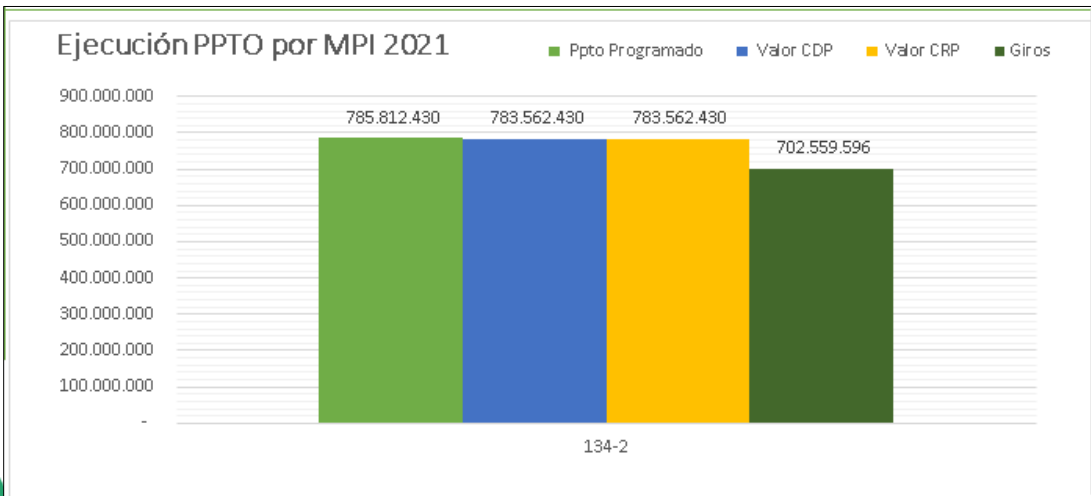


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,35	0,35	0,35	0,35	0%
<b>Total</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>100%</b>


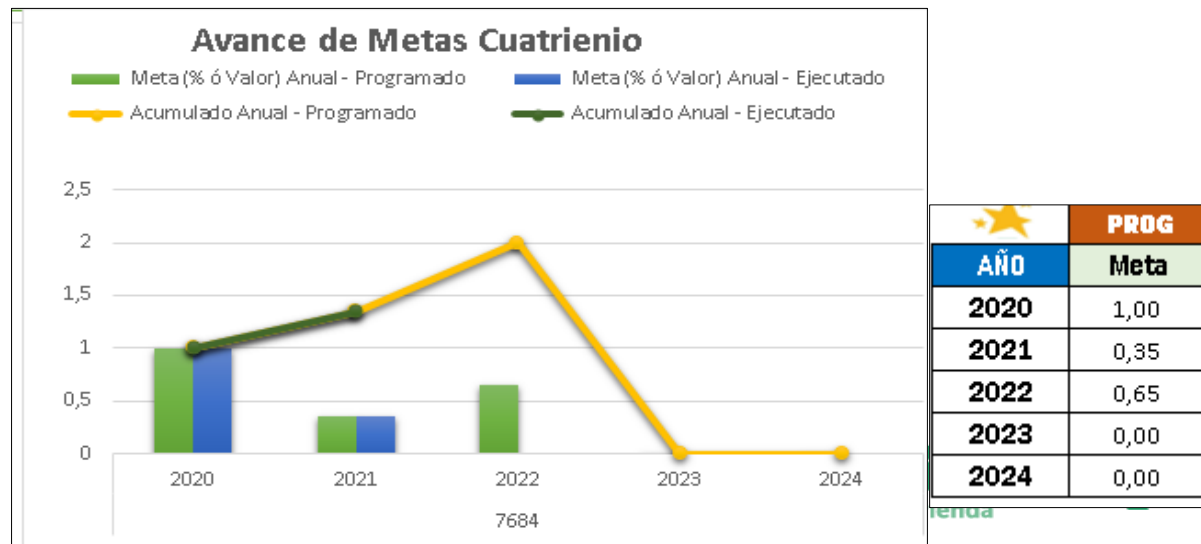


Meta PDD 2020 – 2024: 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades

**MPI: 134-3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria**

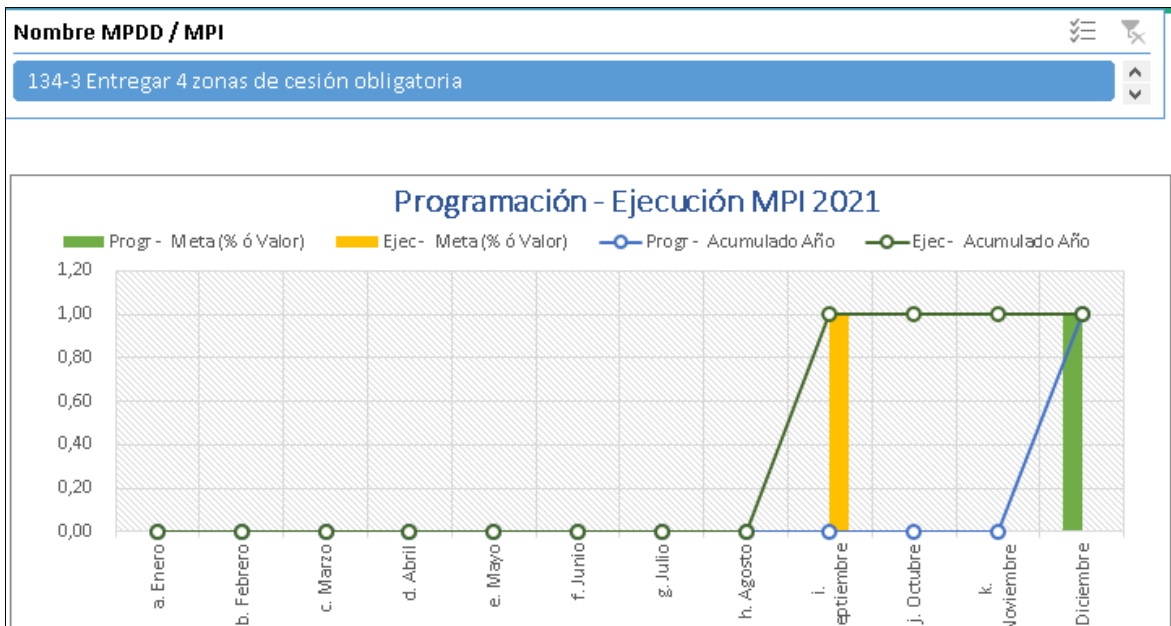

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Noviembre	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Diciembre	1,00	1,00	0,00	1,00	0%
	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>100%</b>	

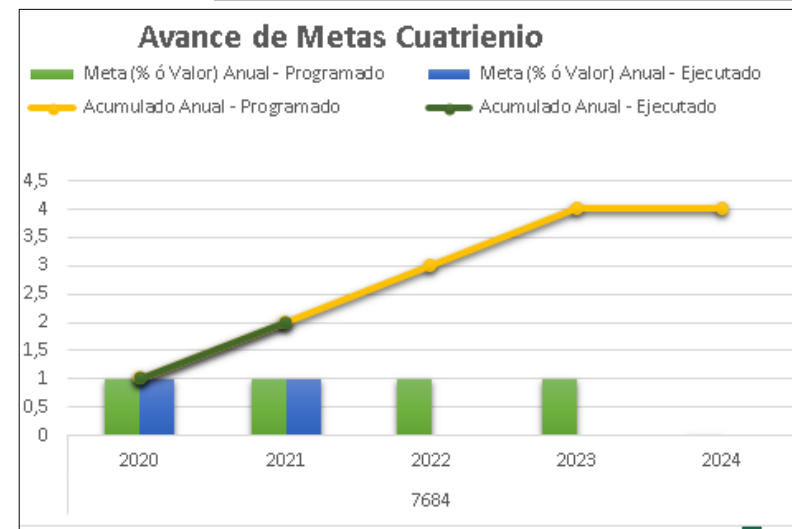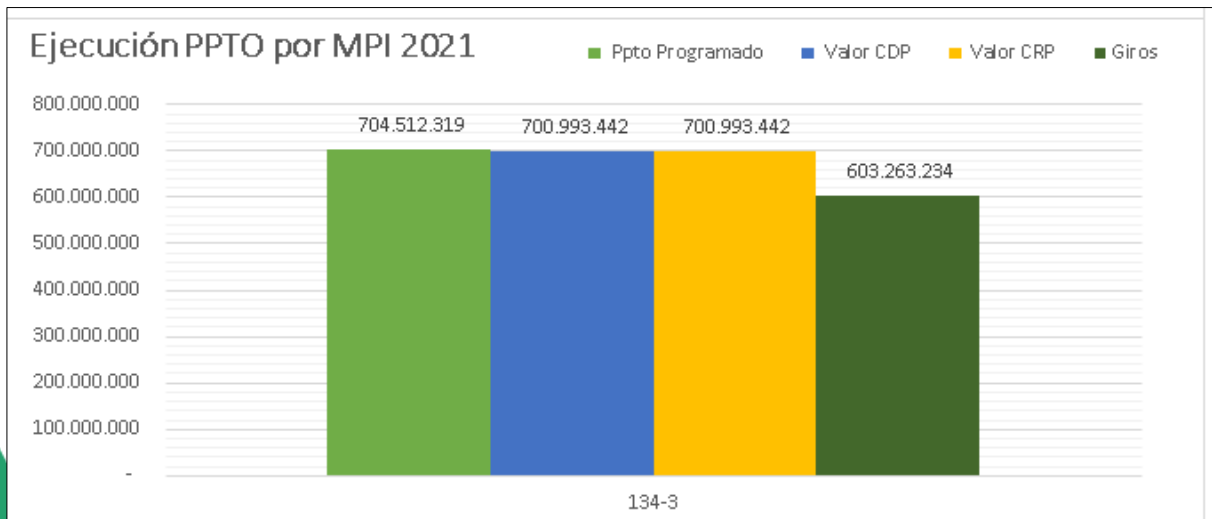

AÑO	PROG Meta
2020	1,00
2021	1,00
2022	1,00
2023	1,00
2024	0,00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.

**Dirección de Reasentamientos**



**BOGOTÁ**  
Caja de la Vivienda  
Popular


<b>VALOR TOTAL 2021</b>		<b>23.664.095.000</b>
<b>Ejecución a diciembre</b>	<b>99,37%</b>	<b>23.514.040.919</b>
<b>Sin comprometer</b>	<b>0,63%</b>	<b>150.054.081</b>

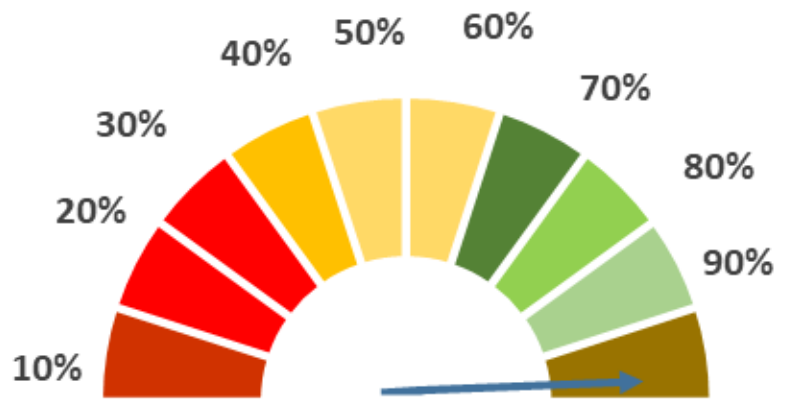

CDP	CRP	GIROS
23.511.665.944	23.514.040.919	23.010.724.981
99,36%	99,37%	97,24%



<b>Total Reservas PI - 2021</b>		<b>5.331.011.683</b>
<b>BMT</b>	5,10%	271.746.924
<b>UNCSAB</b>	94,90%	5.059.264.759
<b>Girado a diciembre</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.331.011.683</b>
<b>Por girar</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

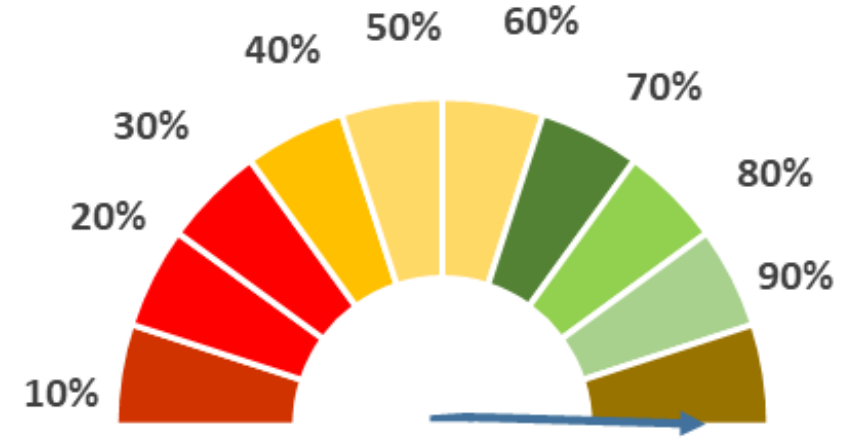


### Pasivos exigibles

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2020	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar diciembre 2021
Dirección de Reasentamientos Humanos	8.720.827.182	706.497.964	824.018.384	7.190.310.834




Meta PDD 2020 – 2024: 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos

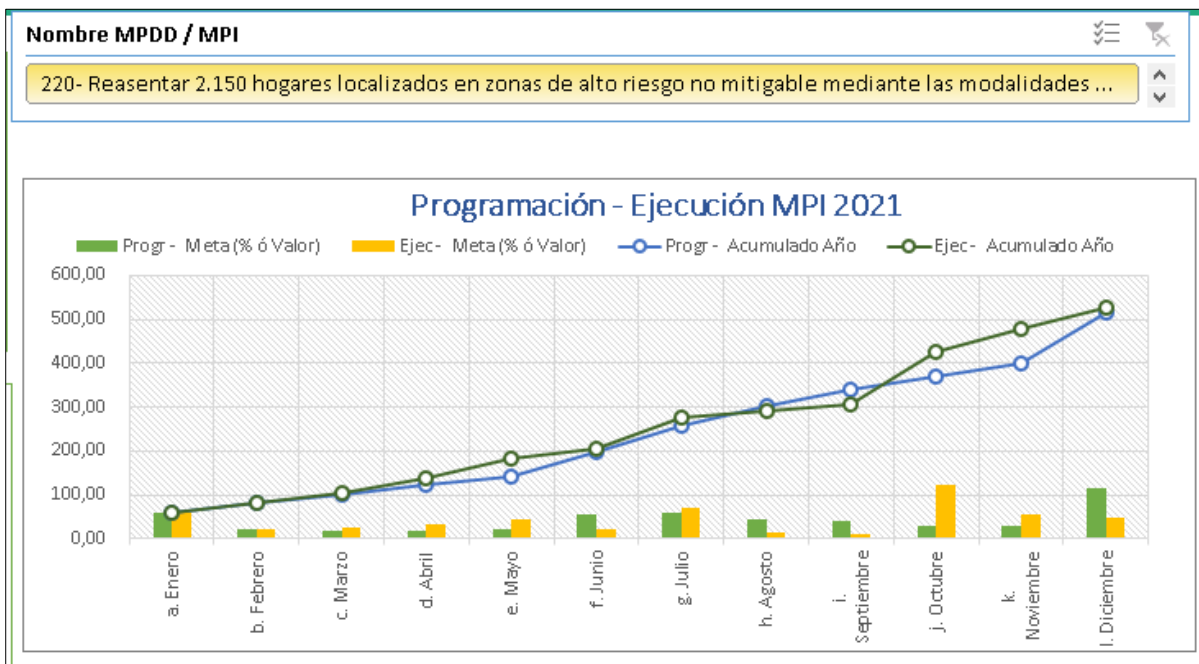

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	60,00	60,00	59,00	59,00	-0,02
Febrero	21,00	81,00	21,00	80,00	-0,01
Marzo	20,00	101,00	24,00	104,00	0,03
Abril	20,00	121,00	35,00	139,00	0,13
Mayo	21,00	142,00	44,00	183,00	0,22
Junio	55,00	197,00	21,00	204,00	0,03
Julio	59,00	256,00	72,00	276,00	0,07
Agosto	45,00	301,00	16,00	292,00	-0,03
Septiembre	40,00	341,00	12,00	304,00	-0,12
Octubre	30,00	371,00	121,00	425,00	0,13
Noviembre	30,00	401,00	54,00	479,00	0,16
Diciembre	115,00	516,00	47,00	526,00	2%
	<b>516,00</b>		<b>526,00</b>	<b>102%</b>	


PI / MPI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% Ejec
7698						
220	23.664.095.000	23.511.665.944	23.514.040.919	23.010.724.981	503.315.938	99,4%

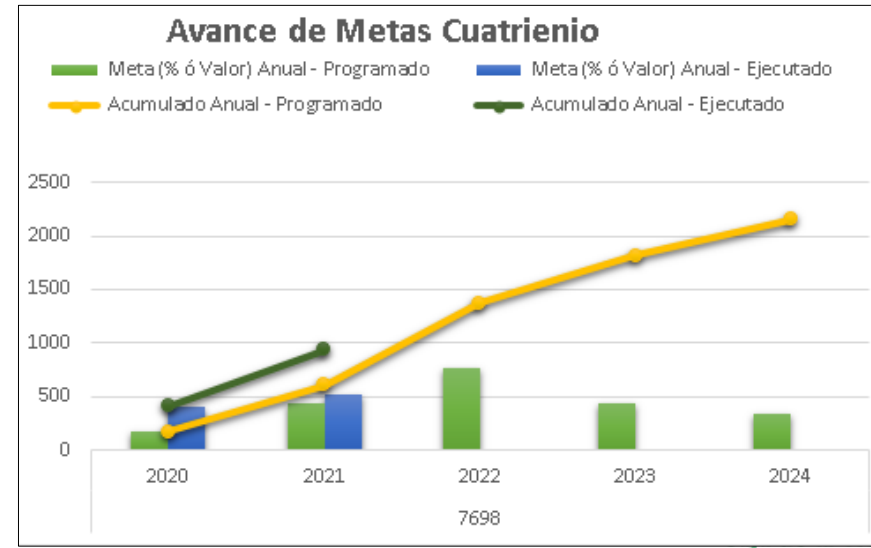



AÑO	PROG Meta
2020	174,00
2021	431,00
2022	764,00
2023	446,00
2024	335,00

Meta PDD 2020 – 2024: 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos

**MPI: 220-1. Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.**

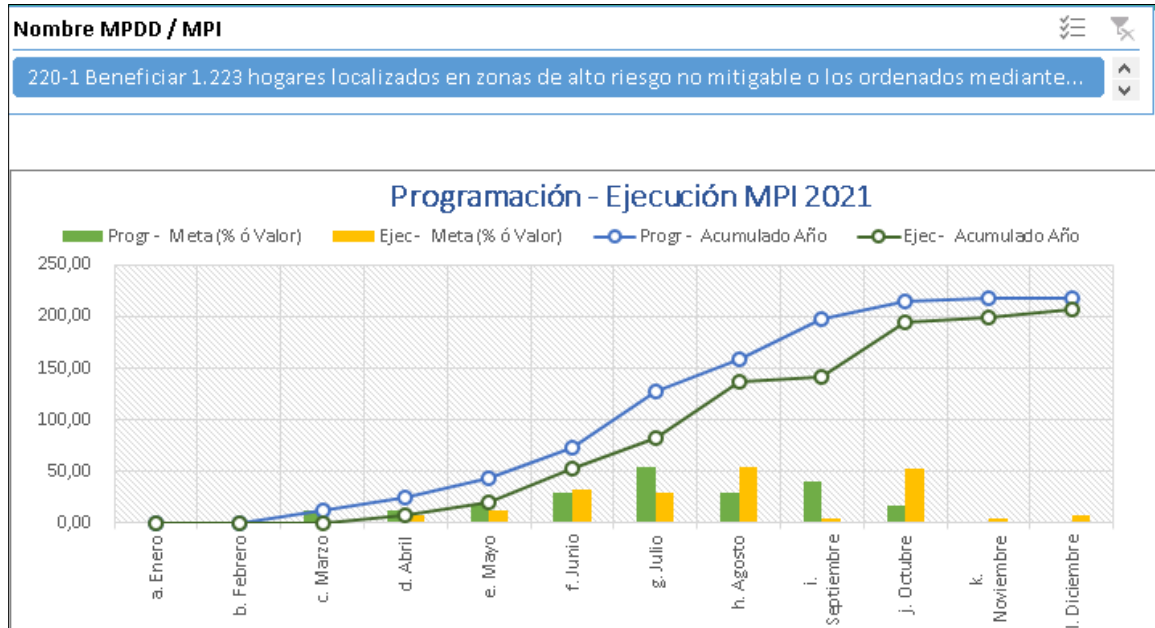

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marzo	12,00	12,00	0,00	0,00	
Abril	12,00	24,00	7,00	7,00	-2,43
Mayo	19,00	43,00	13,00	20,00	-1,15
Junio	30,00	73,00	33,00	53,00	-0,38
Julio	55,00	128,00	29,00	82,00	-0,56
Agosto	30,00	158,00	55,00	137,00	-0,15
Septiembre	40,00	198,00	4,00	141,00	-0,40
Octubre	17,00	215,00	53,00	194,00	-0,11
Noviembre	2,00	217,00	5,00	199,00	-0,09
Diciembre	0,00	217,00	8,00	207,00	-5%
<b>Total</b>	<b>217,00</b>		<b>207,00</b>	<b>95%</b>	

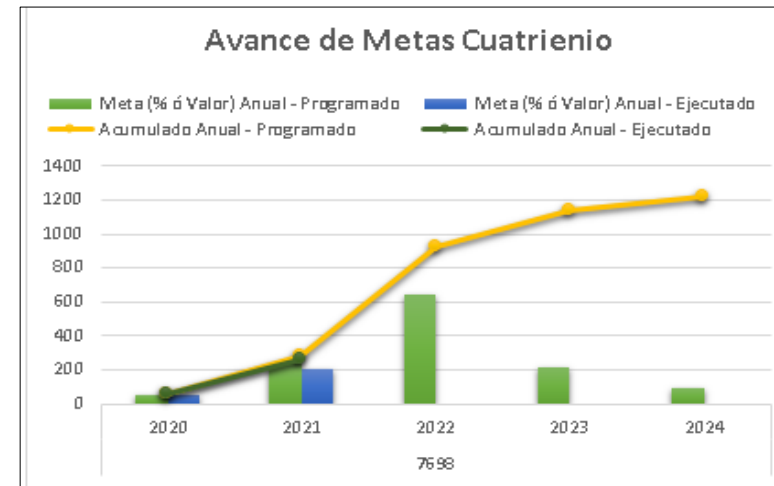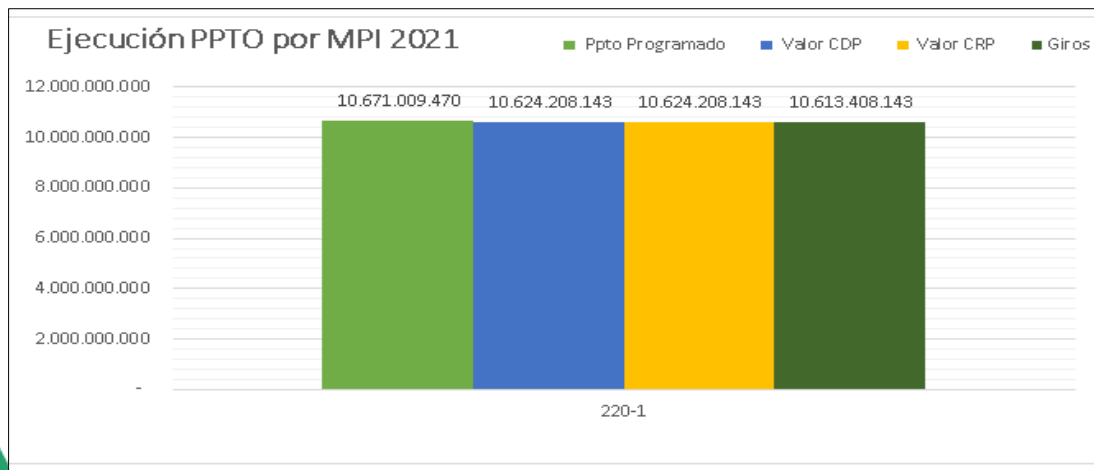


AÑO	PROG Meta
2020	54,00
2021	230,00
2022	640,00
2023	212,00
2024	87,00





Meta PDD 2020 – 2024: 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos

*MPI: 220-2. Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.*

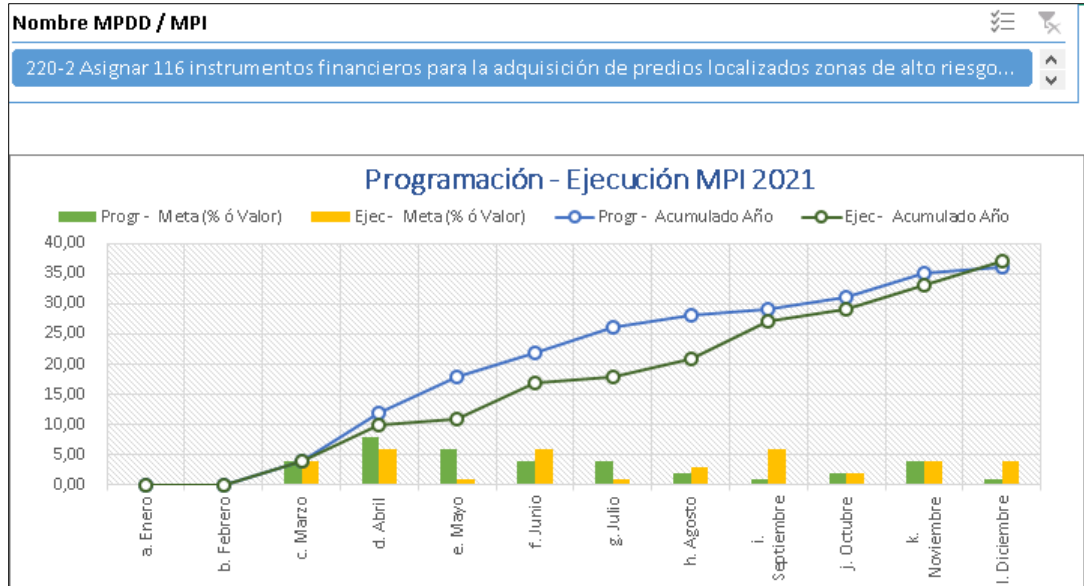


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marzo	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Abril	8,00	12,00	6,00	10,00	-0,20
Mayo	6,00	18,00	1,00	11,00	-0,64
Junio	4,00	22,00	6,00	17,00	-0,29
Julio	4,00	26,00	1,00	18,00	-0,44
Agosto	2,00	28,00	3,00	21,00	-0,33
Septiembre	1,00	29,00	6,00	27,00	-0,07
Octubre	2,00	31,00	2,00	29,00	-0,07
Noviembre	4,00	35,00	4,00	33,00	-0,06
Diciembre	1,00	36,00	4,00	37,00	3%
	<b>36,00</b>		<b>37,00</b>	<b>103%</b>	

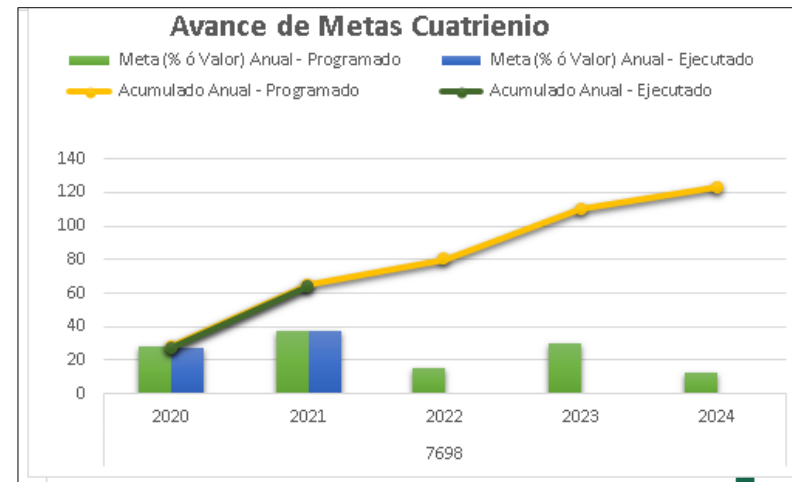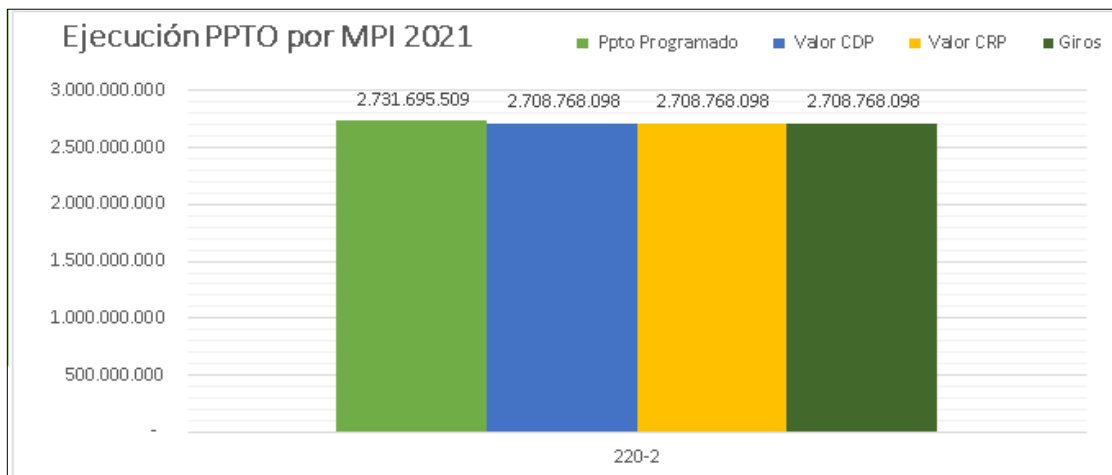



AÑO	PROG Meta
2020	28
2021	36
2022	30
2023	15
2024	7

Meta PDD 2020 – 2024: 220. Reasentar 1.850 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos

**MPI: 220-3. Beneficiar 1.850 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria.**

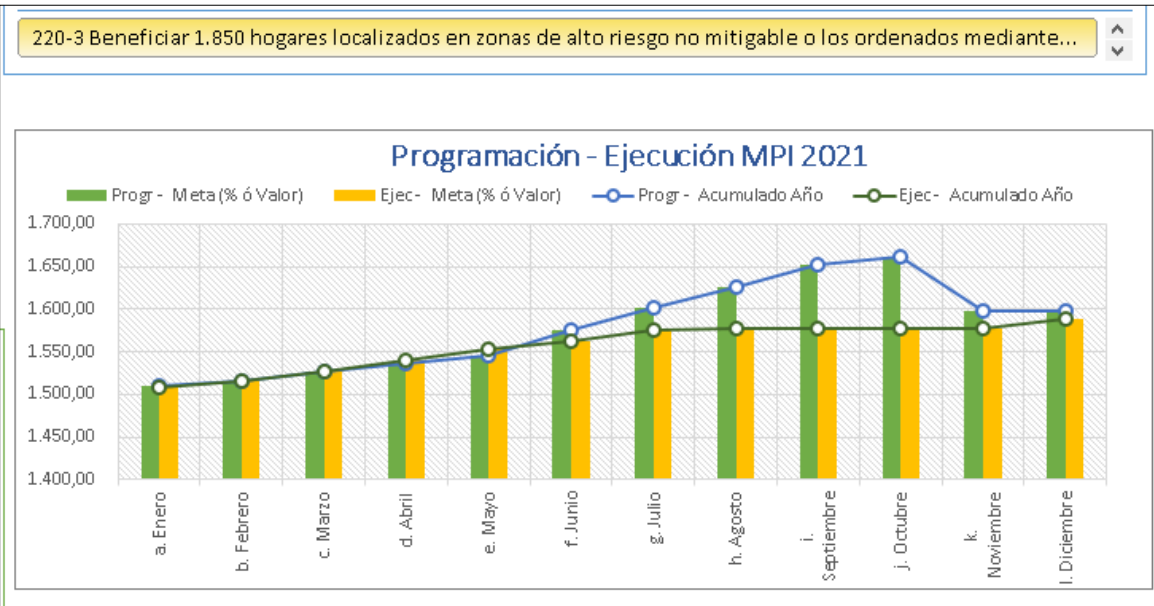

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	1,510	1,510	1,508	1,508	0.00
Febrero	1,516	1,516	1,516	1,516	0.00
Marzo	1,526	1,526	1,526	1,526	0.00
Abril	1,536	1,536	1,540	1,540	0.00
Mayo	1,546	1,546	1,553	1,553	0.00
Junio	1,576	1,576	1,563	1,563	-0.01
Julio	1,601	1,601	1,575	1,575	-0.02
Agosto	1,626	1,626	1,577	1,577	-0.03
Septiembre	1,651	1,651	1,577	1,577	-0.05
Octubre	1,661	1,661	1,578	1,578	-0.05
Noviembre	1,598	1,598	1,578	1,578	-0.01
Diciembre	1,598	1,598	1,588	1,588	-1%
	<b>1,598</b>		<b>1,588</b>	<b>99%</b>	

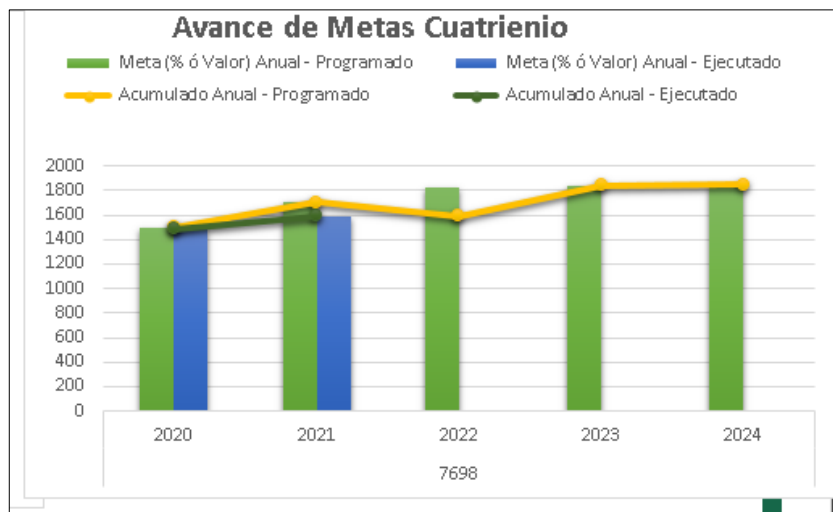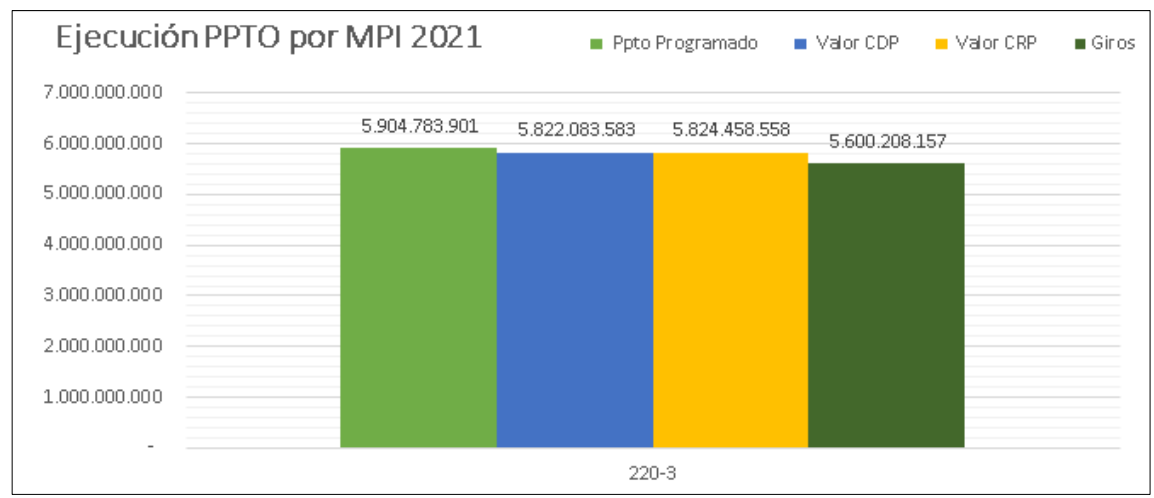


AÑO	PROG Meta
2020	1,497
2021	1,598
2022	1,824
2023	1,840
2024	1,850





Meta PDD 2020 – 2024: 220. Reasentar 1.374 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos

**MPI: 220-4. 220-4 Beneficiar 1.749 hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva**

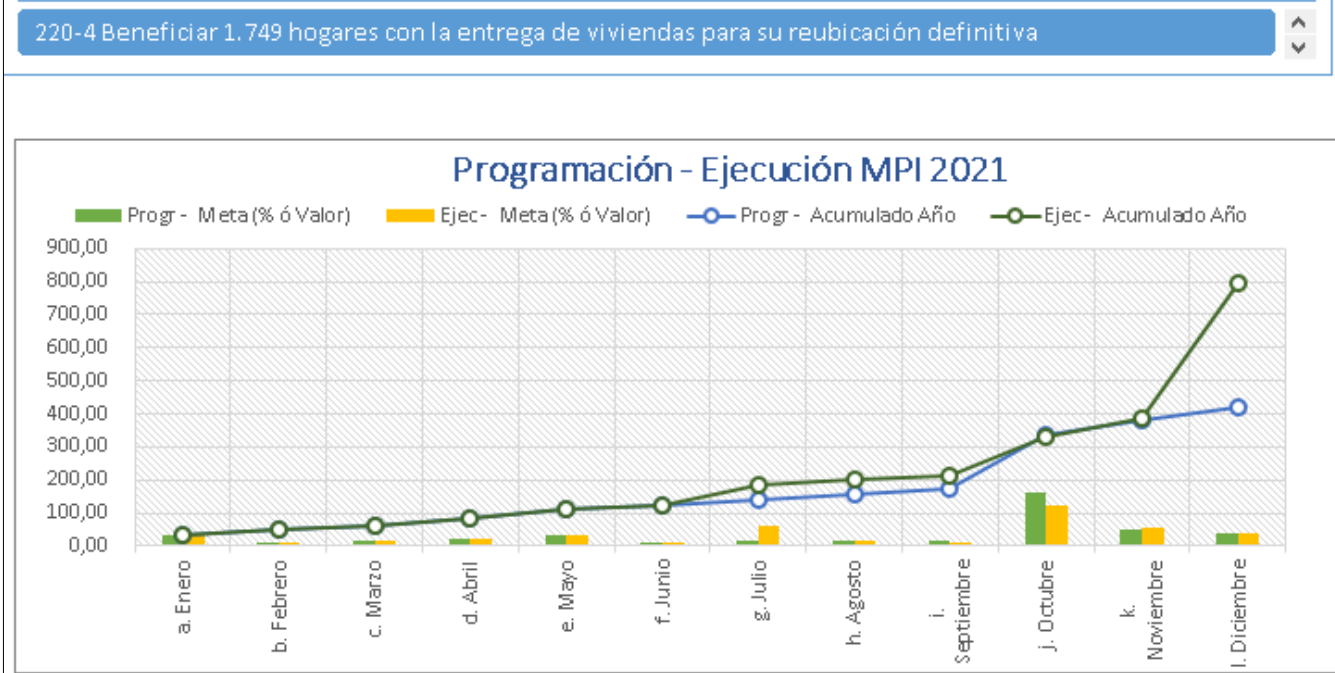

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	35	35	35	35	0,00
Febrero	13	48	13	48	0,00
Marzo	14	62	14	62	0,00
Abril	21	83	21	83	0,00
Mayo	31	114	31	114	0,00
Junio	11	125	11	125	0,00
Julio	16	141	60	185	0,24
Agosto	16	157	14	199	0,21
Septiembre	16	173	12	211	0,18
Octubre	160	333	120	331	-0,01
Noviembre	50	383	54	385	0,01
Diciembre	37	420	37	797	47%
<b>Total</b>	<b>420</b>		<b>422</b>	<b>100%</b>	


**Nota:** Para el cierre de la vigencia además de los 422 hogares beneficiados en 2021, se incluyeron los 375 hogares a los que se le entregó vivienda para reubicación definitiva durante la vigencia 2020 del presente PDD, los cuales no se habían reportado ya que la meta se incluyó en el proyecto en la vigencia 2021.

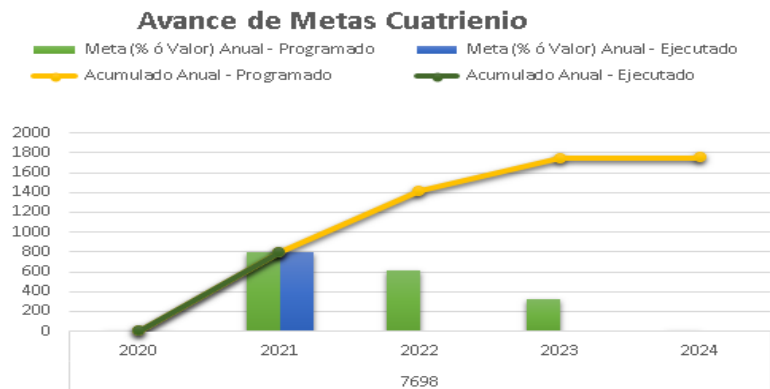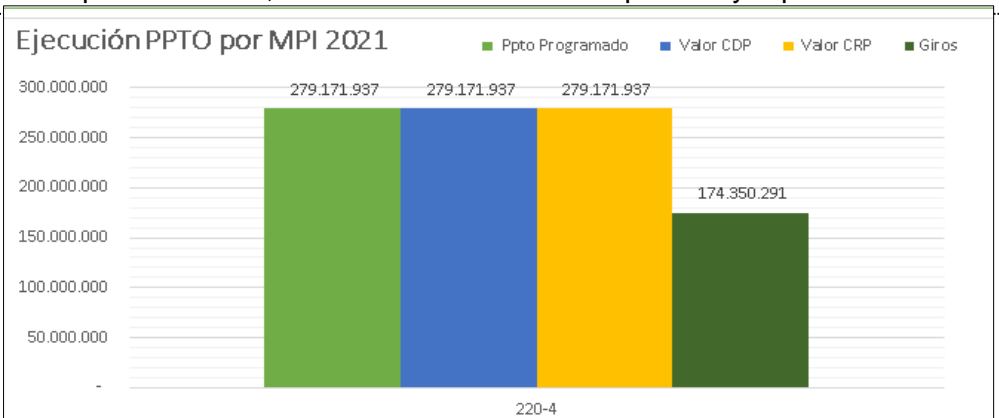



AÑO	PROG Meta
2020	0
2021	795
2022	620
2023	324
2024	10

**Meta PDD 2020 – 2024: 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos**

**MPI: 220-5. Gestionar 100% de las actividades del programa de reasentamientos mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones**

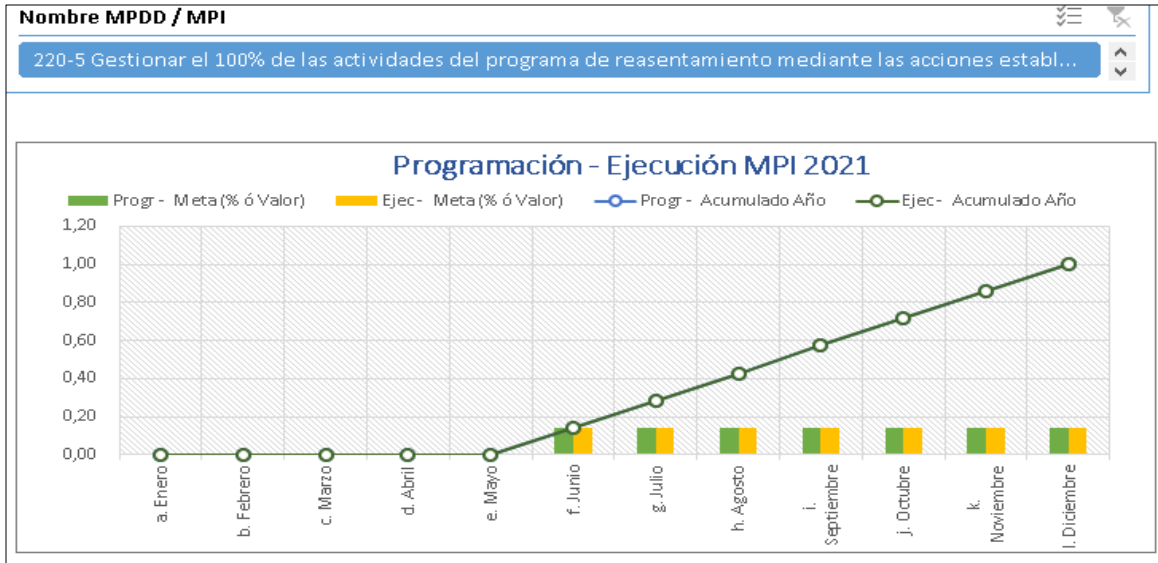

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Febrero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Marzo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Abril	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Mayo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Junio	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	0,00
Julio	14,3%	28,6%	14,3%	28,6%	0,00
Agosto	14,3%	42,9%	14,3%	42,9%	0,00
Septiembre	14,3%	57,1%	14,3%	57,1%	0,00
Octubre	14,3%	71,4%	14,3%	71,4%	0,00
Noviembre	14,3%	85,7%	14,3%	85,7%	0,00
Diciembre	14,3%	100,0%	14,3%	100,0%	0%
	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,0%</b>	

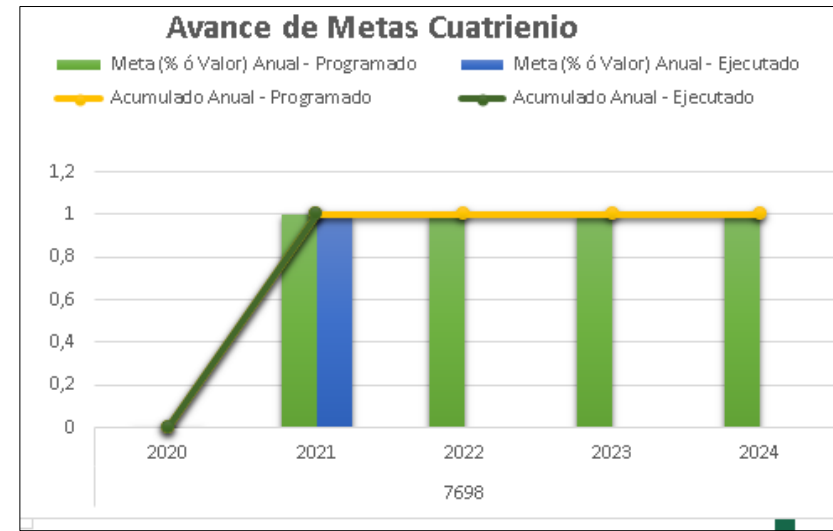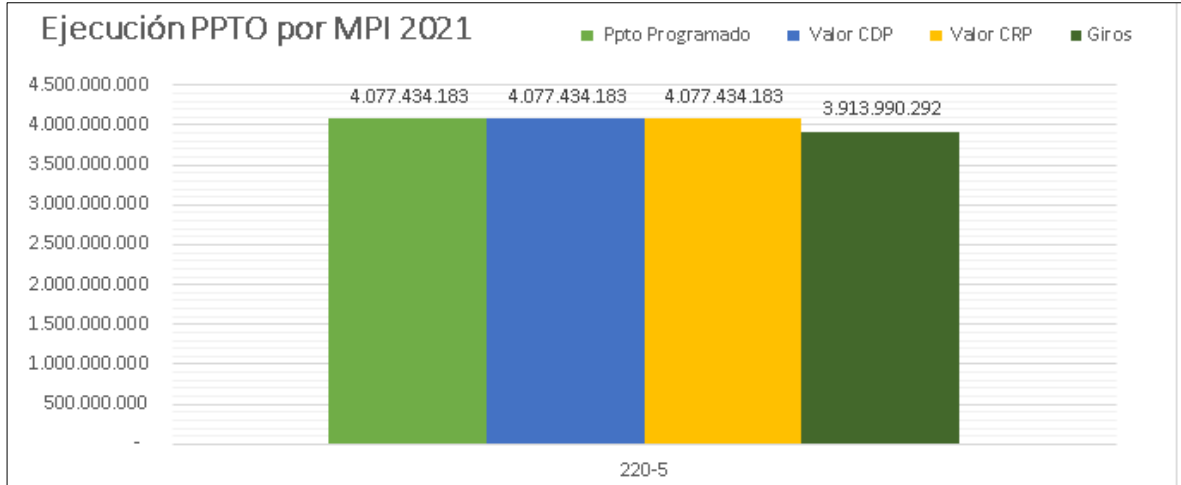

AÑO	PROG Meta
2020	0%
2021	100%
2022	100%
2023	100%
2024	100%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT


Caja de la Vivienda Popular

Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular.

Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario



<b>VALOR TOTAL 2021</b>		<b>9.245.692.000</b>
<b>Ejecución a diciembre</b>	<b>99,73%</b>	<b>9.220.635.808</b>
<b>Sin comprometer</b>	<b>0,27%</b>	<b>25.056.192</b>

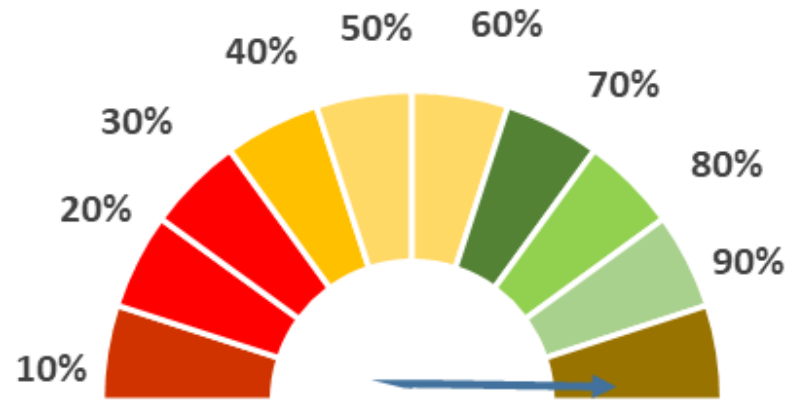


Ejecución vigencia – diciembre 2021

CDP	CRP	GIROS
9.220.635.808	9.220.635.808	7.508.776.274
99,73%	99,73%	81,21%



Reasentamientos  
Humanos

<b>Total Reservas PI - 2021</b>		<b>3.916.242.623</b>
<b>BMT</b>	8,64%	338.309.032
<b>UNCSAB</b>	91,36%	3.577.933.591
<b>Girado a diciembre</b>	<b>99,99%</b>	<b>3.915.842.125</b>
<b>Por girar</b>	<b>0,01%</b>	<b>400.498</b>




Giros reservas – diciembre 2021 / reservas BMT + UNCSAB

## Pasivos exigibles


ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2020	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar diciembre 2021
Dirección Corporativa - Fortalecimiento	95.152.738	45.320.001	0	49.832.737
Dirección Corporativa - Comunicaciones	5.429.589	5.185.200	244.389	0
Dirección Corporativa - TICs	54.540.771	22.757.547	31.783.224	0
Dirección Corporativa -Funcionamiento	84.588.588	21.071.666	60.700.533	2.816.389
<b>TOTAL CVP</b>	<b>10.313.259.124</b>	<b>1.355.057.259</b>	<b>1.302.519.558</b>	<b>7.655.682.307</b>

**Meta PDD 2020 – 2024: 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP.**

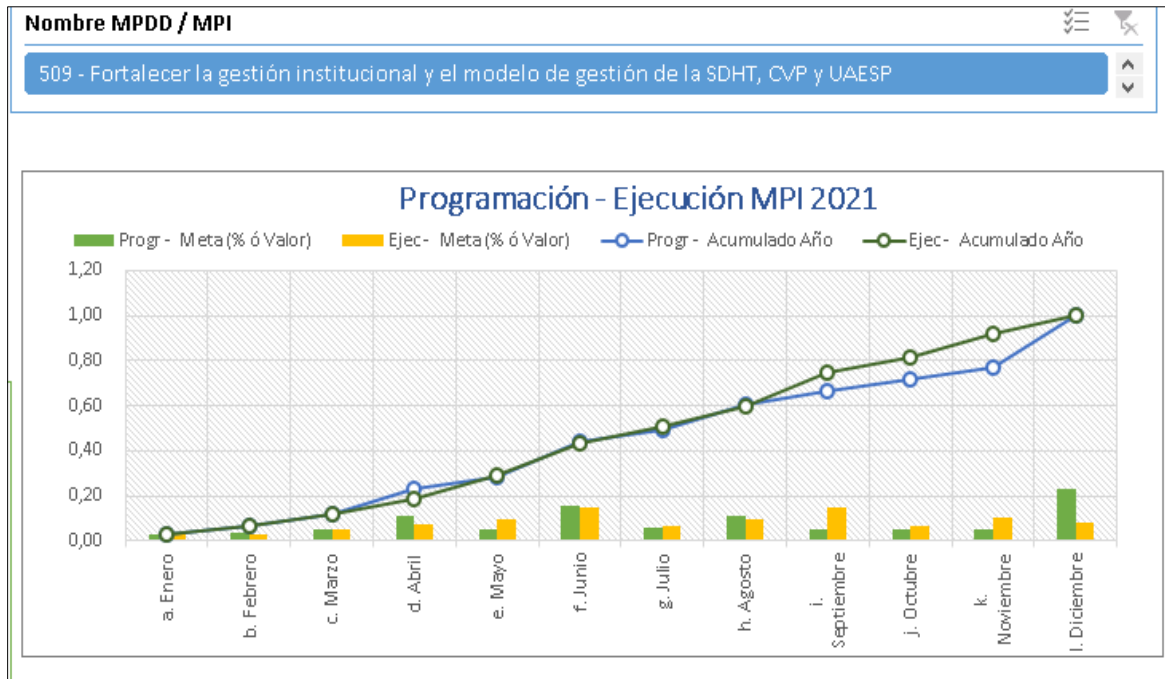


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	0,00
Febrero	3,3%	6,5%	3,2%	6,4%	-0,02
Marzo	5,4%	11,9%	5,4%	11,8%	-0,01
Abril	11,4%	23,3%	7,1%	18,9%	-0,23
Mayo	5,3%	28,5%	9,8%	28,7%	0,01
Junio	15,3%	43,8%	14,8%	43,6%	-0,01
Julio	5,6%	49,4%	6,8%	50,4%	0,02
Agosto	11,2%	60,6%	9,6%	60,0%	-0,01
Septiembre	5,4%	66,0%	14,8%	74,8%	0,12
Octubre	5,4%	71,4%	6,7%	81,5%	0,12
Noviembre	5,2%	76,6%	10,2%	91,7%	0,17
Diciembre	23,4%	100,0%	8,3%	99,9%	0%
	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

PI / MPI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Valor Giros	Valor por Girar	% Ejec
7696						
<b>509</b>	9.245.692.000	9.220.635.808	9.220.635.808	7.508.776.274	1.711.859.534	99,7%

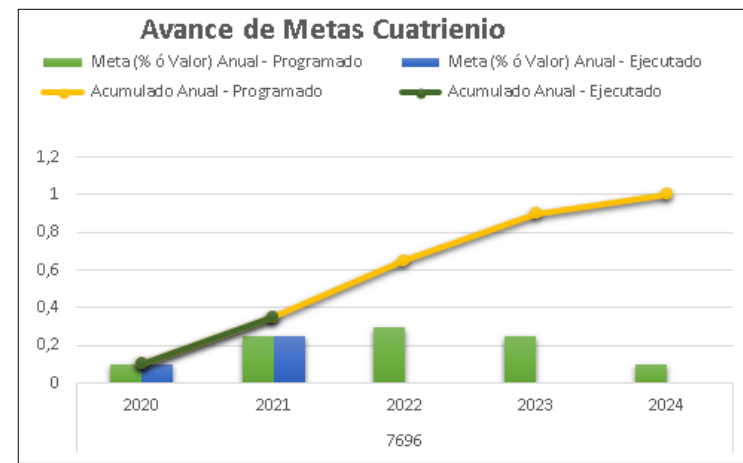



Meta PDD 2020 – 2024: 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP.

**MPI: 509-1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.**

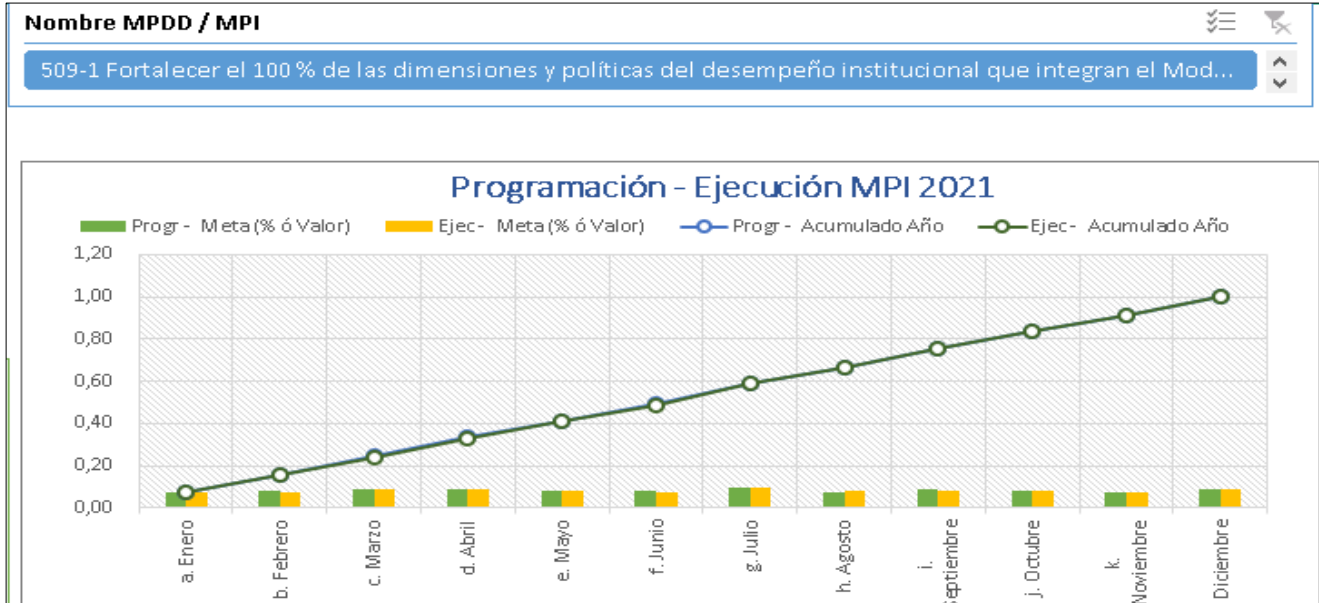

Dirección de Gestión Corporativa y CID  
 Subdirección Administrativa  
 Subdirección Financiera

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	0,00
Febrero	8,0%	15,6%	7,7%	15,3%	-0,02
Marzo	8,9%	24,5%	8,9%	24,2%	-0,01
Abril	8,8%	33,3%	8,6%	32,8%	-0,02
Mayo	8,0%	41,3%	8,4%	41,1%	-0,01
Junio	8,1%	49,4%	7,7%	48,8%	-0,01
Julio	9,5%	58,9%	10,0%	58,8%	0,00
Agosto	7,7%	66,6%	8,0%	66,8%	0,00
Septiembre	8,6%	75,2%	8,4%	75,2%	0,00
Octubre	8,3%	83,5%	8,3%	83,5%	0,00
Noviembre	7,6%	91,1%	7,6%	91,1%	0,00
Diciembre	8,9%	100,0%	8,7%	99,8%	0%
	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

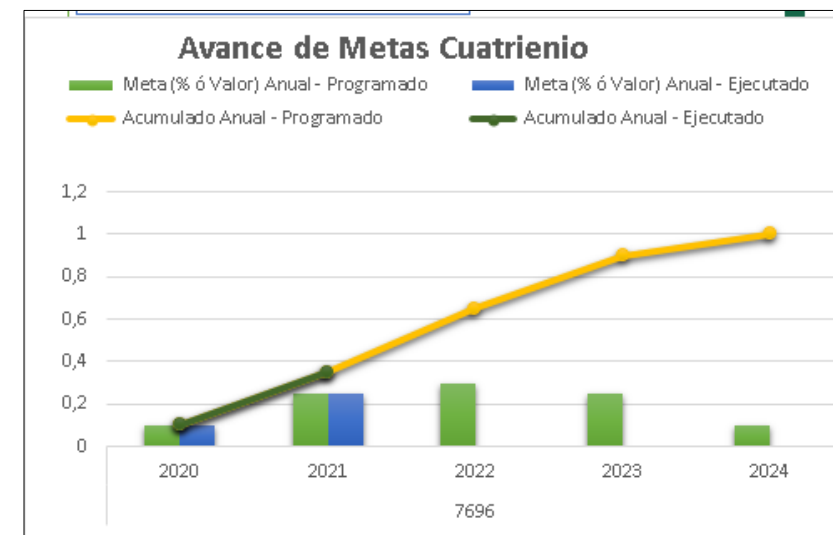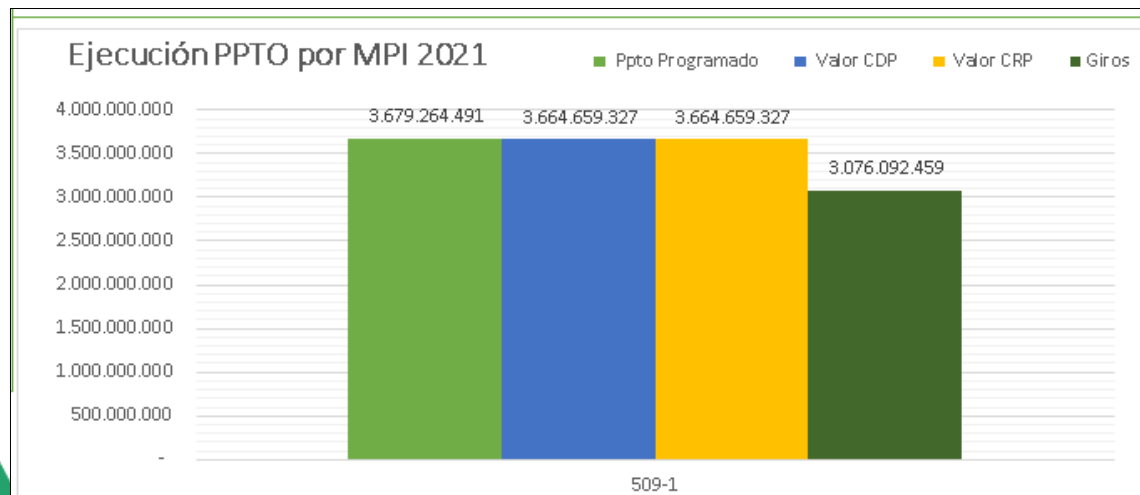


AÑO	PROG Meta
2020	10%
2021	25%
2022	30%
2023	25%
2024	10%





Meta PDD 2020 – 2024: 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP.

**MPI: 509-2. Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.**

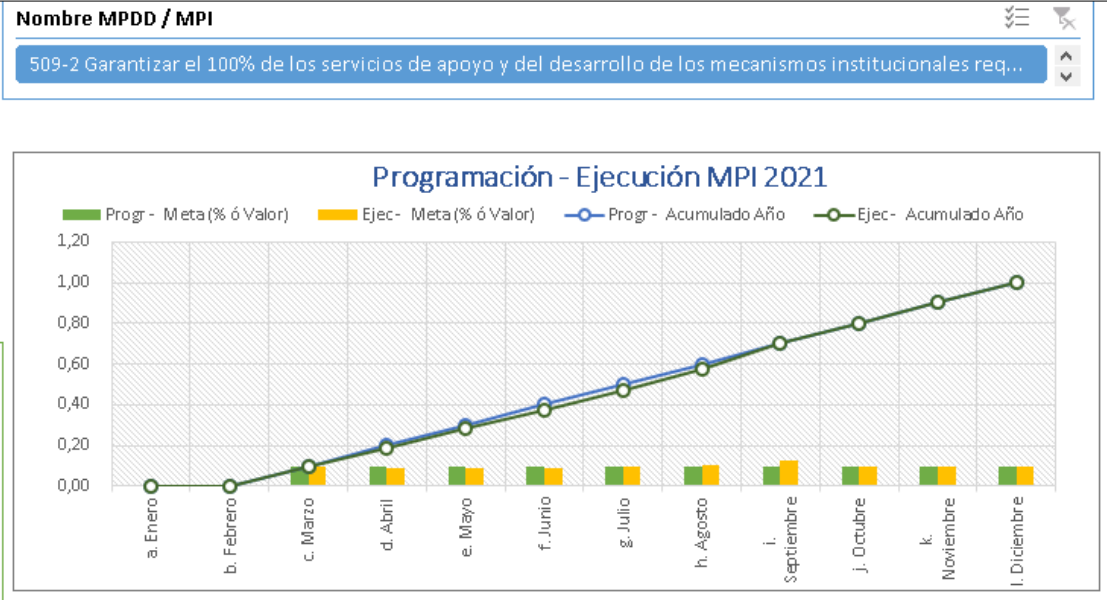

Dirección de Gestión Corporativa y CID  
Subdirección Administrativa  
Subdirección Financiera


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Febrero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Marzo	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	0,00
Abril	10,0%	20,0%	8,8%	18,8%	-0,06
Mayo	10,0%	30,0%	9,2%	28,0%	-0,07
Junio	10,0%	40,0%	9,2%	37,2%	-0,08
Julio	10,0%	50,0%	10,0%	47,2%	-0,06
Agosto	10,0%	60,0%	10,4%	57,6%	-0,04
Septiembre	10,0%	70,0%	12,4%	70,0%	0,00
Octubre	10,0%	80,0%	10,0%	80,0%	0,00
Noviembre	10,0%	90,0%	10,0%	90,0%	0,00
Diciembre	10,0%	100,0%	10,0%	100,0%	0%
	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

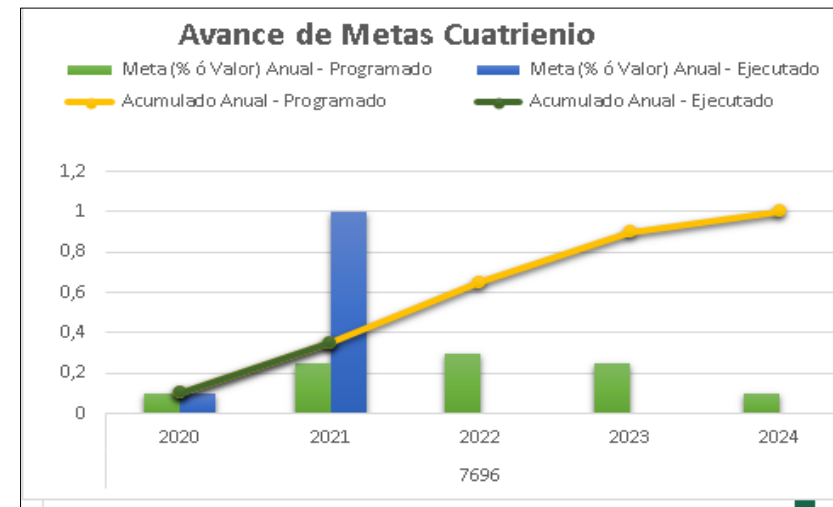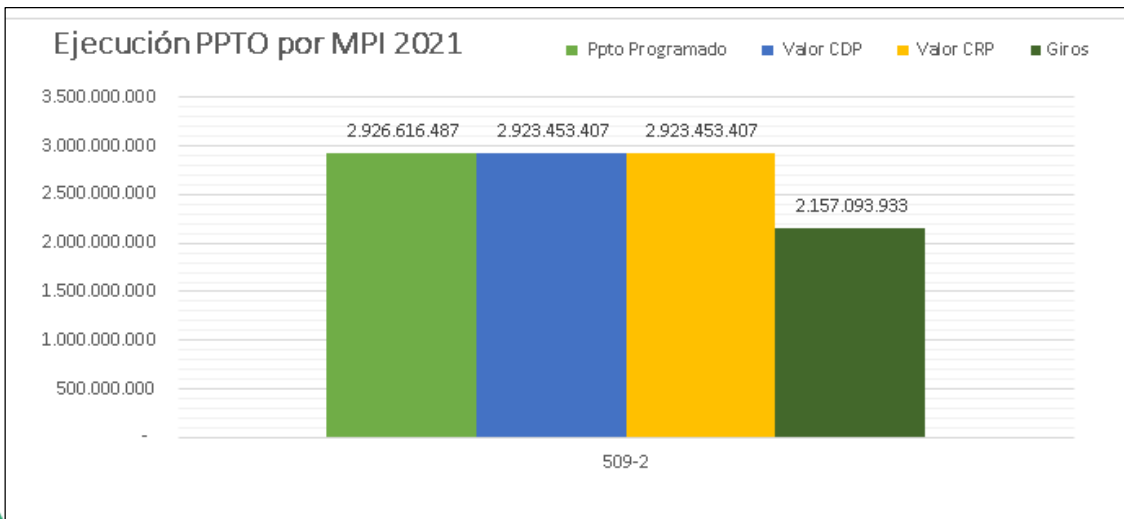



AÑO	PROG Meta
2020	10%
2021	25%
2022	30%
2023	25%
2024	10%

Meta PDD 2020 – 2024: 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP.

**MPI: 509-3. Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018 -2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".**

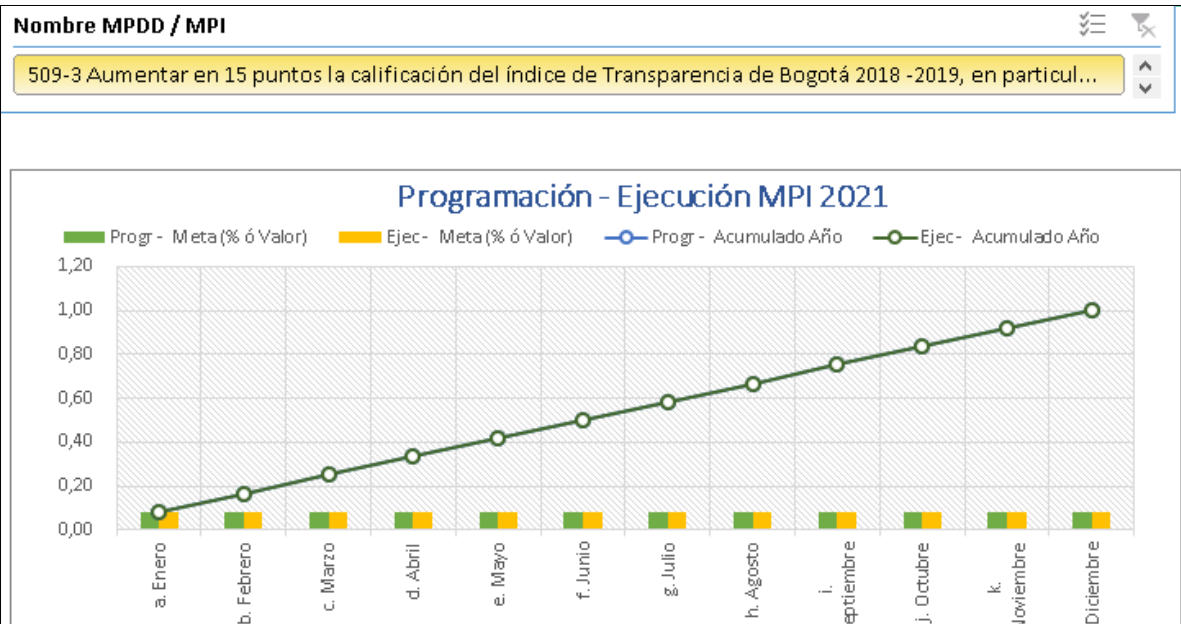


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	0,00
Febrero	8,3%	16,7%	8,3%	16,7%	0,00
Marzo	8,3%	25,0%	8,3%	25,0%	0,00
Abril	8,3%	33,3%	8,3%	33,3%	0,00
Mayo	8,3%	41,7%	8,3%	41,7%	0,00
Junio	8,3%	50,0%	8,3%	50,0%	0,00
Julio	8,3%	58,3%	8,3%	58,3%	0,00
Agosto	8,3%	66,7%	8,3%	66,7%	0,00
Septiembre	8,3%	75,0%	8,3%	75,0%	0,00
Octubre	8,3%	83,3%	8,3%	83,3%	0,00
Noviembre	8,3%	91,7%	8,3%	91,7%	0,00
Diciembre	8,3%	100,0%	8,3%	100,0%	0%
	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

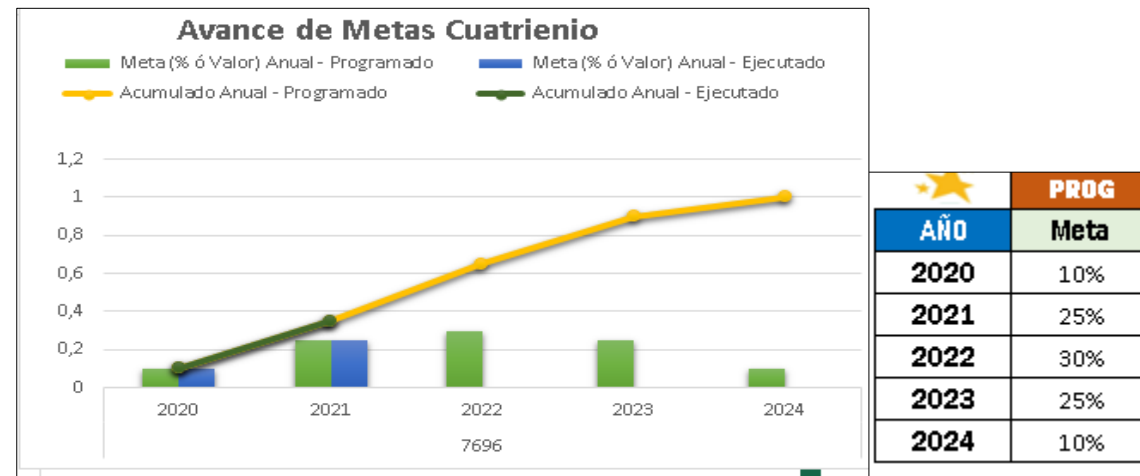
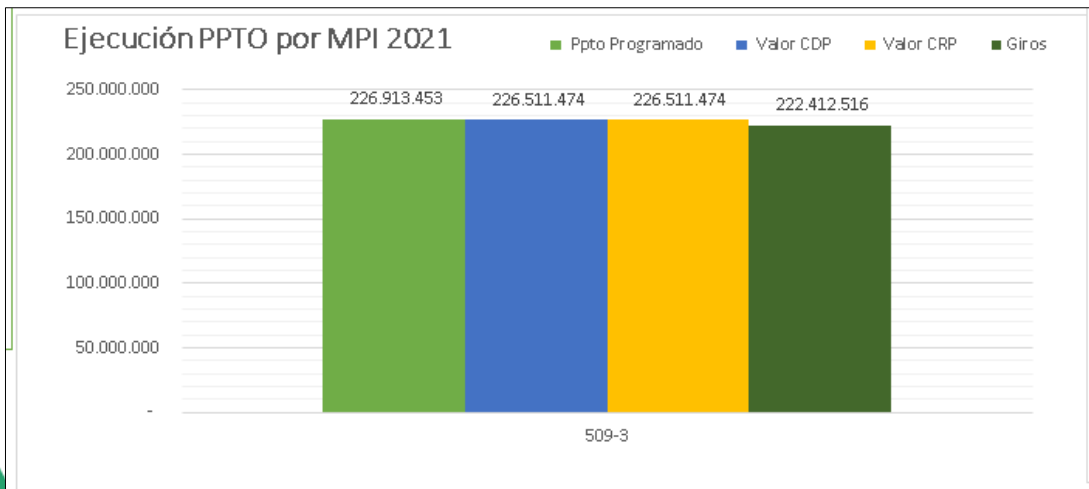


Meta PDD 2020 – 2024: 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP.

*MPI: 509-4. Articular e implementar el 100% del proceso de arquitectura empresarial de TIC.*

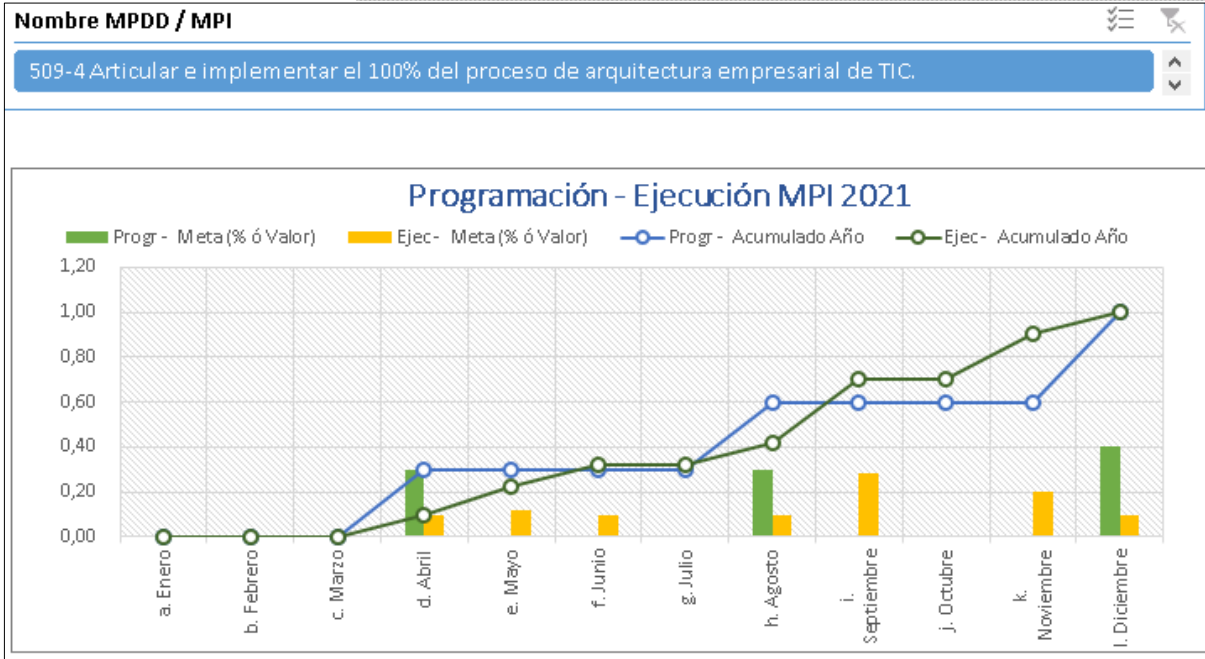


Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum	
Enero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Febrero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Marzo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Abril	30,0%	30,0%	10,0%	10,0%	-2,00
Mayo	0,0%	30,0%	12,0%	22,0%	-0,36
Junio	0,0%	30,0%	10,0%	32,0%	0,06
Julio	0,0%	30,0%	0,0%	32,0%	0,06
Agosto	30,0%	60,0%	10,0%	42,0%	-0,43
Septiembre	0,0%	60,0%	28,0%	70,0%	0,14
Octubre	0,0%	60,0%	0,0%	70,0%	0,14
Noviembre	0,0%	60,0%	20,0%	90,0%	0,33
Diciembre	40,0%	100,0%	10,0%	100,0%	0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

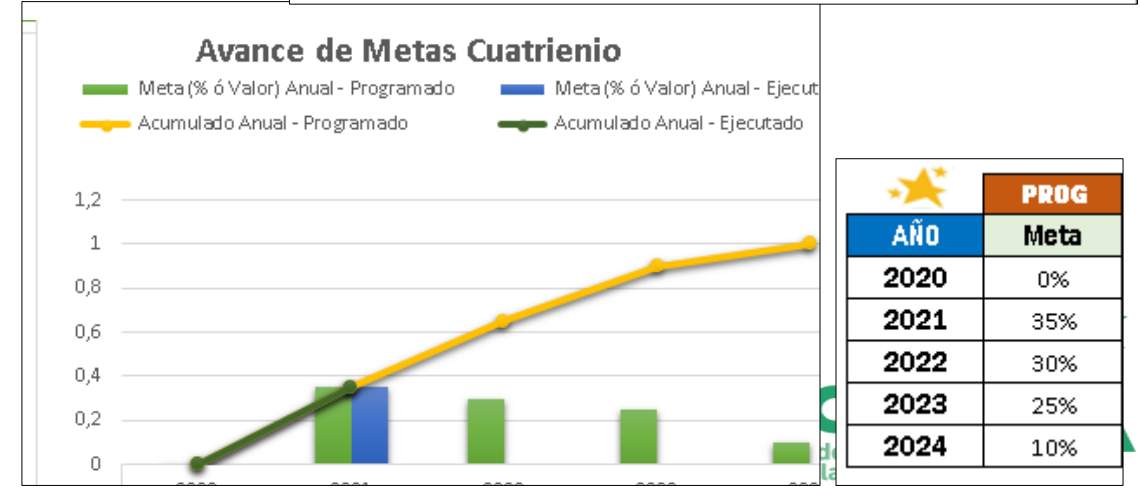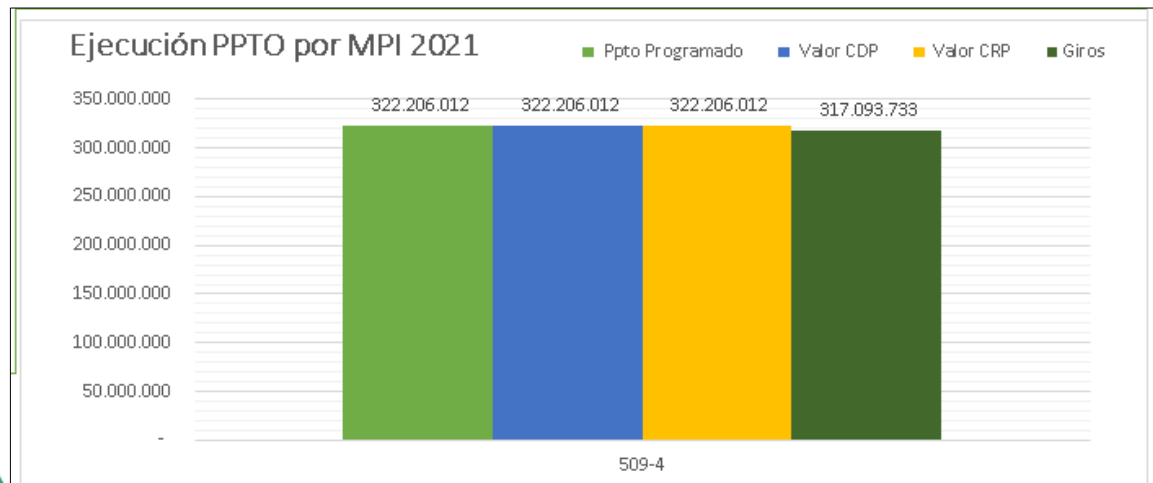



PROG	Meta
2020	0%
2021	35%
2022	30%
2023	25%
2024	10%

Meta PDD 2020 – 2024: 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP.

*MPI: 509-5. Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.*

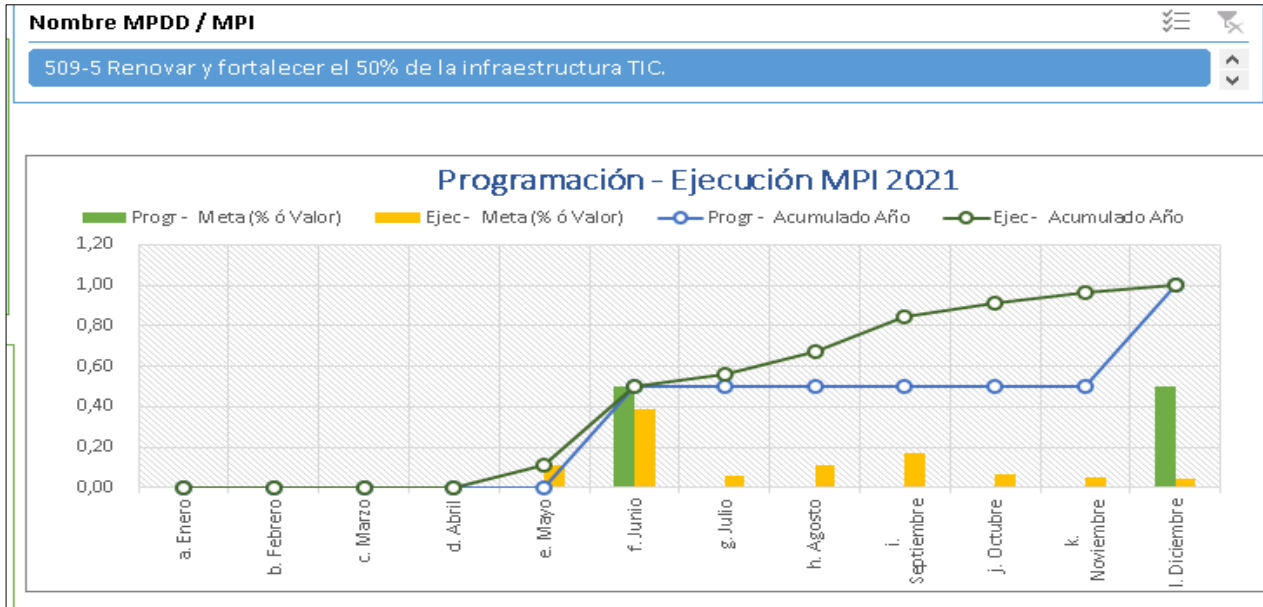

Mes	PROGRAMADO 2021		EJECUTADO 2021		Variación acum
	Meta	Acum	Meta	Acum	%
Enero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Febrero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Marzo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Abril	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Mayo	0,0%	0,0%	11,0%	11,0%	1,00
Junio	50,0%	50,0%	39,0%	50,0%	0,00
Julio	0,0%	50,0%	6,0%	56,0%	0,11
Agosto	0,0%	50,0%	11,0%	67,0%	0,25
Septiembre	0,0%	50,0%	17,0%	84,0%	0,40
Octubre	0,0%	50,0%	7,0%	91,0%	0,45
Noviembre	0,0%	50,0%	5,0%	96,0%	0,48
Diciembre	50,0%	100,0%	4,3%	100,3%	0%
	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

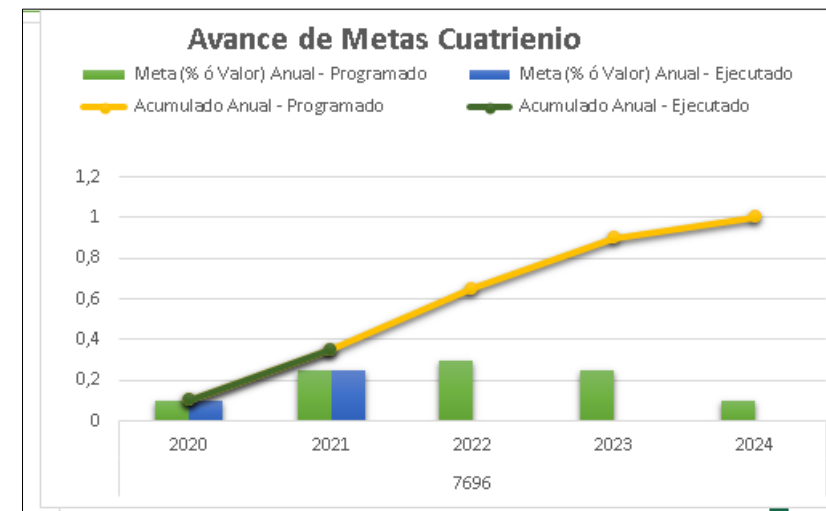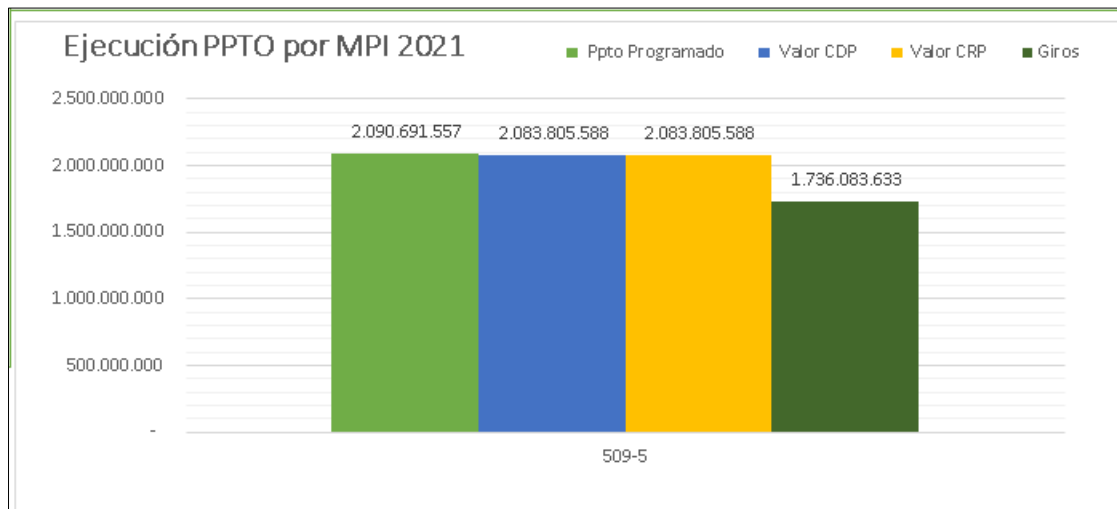

AÑO	PROG Meta
2020	10%
2021	25%
2022	30%
2023	25%
2024	10%

**¡ Gracias !**  
**Cordialmente: OAP**
